

Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28

Плановое выявление и устранение проблем территории

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата.

Предмет проекта — процесс, а не бот: проблему находят до того, как житель напишет обращение. Сигнал подают инициативные группы — активные жители и сотрудники, ежедневно бывающие на территории. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

ПЕРИОД ПРОЕКТА
22.07 – 30.09.2026

ДО ЗАКРЫТИЯ
3 дня

ДО СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
4 дня

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на бланке, к подписи

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
подана 30.07, в срок

КОМАНДА
«Лидеры перемен», 5 человек

КУРАТОР ПРОЕКТА
Ключников А.Ю.

Что сдаём на конкурс до 01.10.2026 · aksenova.aa@mpk.amurobl.ru

Три документа, и всё. В теме письма — название команды «Лидеры перемен» и телефон капитана. Ниже — что из них готово и чего каждому не хватает.

1. Справка проекта

черновик готов

Приложение № 2 к 99-р, заполнена **в самой форме организатора**.

Красным в документе помечено всё неподтверждённое — перед сдачей красного остаться не должно. ↓ черновик Word (в работе)

↓ пустая форма

Нужно: завести инициативные группы в панели (до 22.09 — иначе доля выявленных до обращения останется нулём) · **выгрузка из СЭД «Дело»** по обращениям помесечно · цифры «как стало» из панели (24-25.09) · подтвердить инструменты хронометражем и гембой · расчёт экономического эффекта · **подпись Главы округа**

2. Карточка проекта

95 %

Один лист А4, альбомная, четыре блока. Заполнена и свёрстана. ↓ наша карточка

↓ итоговая форма

Нужно: Ф.И.О. руководителя аппарата — в карточке помечено красным · проставить базу показателей вместо прочерков

Замечание куратора 17.09 учтено: блок «Обоснование выбора» переписан в фактический регистр — без выводов и оценок

3. Отчётная презентация

95 %

14 слайдов на итоговом шаблоне МПК. **Заглушек не осталось** — все слайды с содержимым. **Сверена с оценочным листом построчно:** все девять критериев показаны на слайдах. [↓ черновик \(в работе\)](#) [↓ шаблон](#)

Нужно: фактические цифры вместо расчётных — замер 24–25.09 (карта достигнутого, сл. 8 и 9) · фотографии прежнего процесса и обезличенные экраны к таблицам на сл. 10–11

Разбор тестов курса

30 вопросов курса с ответами и пояснениями — для ознакомления перед обучением. Зелёным отмечены верные варианты, оранжевым — пять вопросов, где правильный ответ неочевиден: там курс считает не так, как учебник, и это стоит перечитать.

Открывается отдельной страницей. Пригодится двоим, кому обучение ещё предстоит.

Сам курс — где проходить

«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» — базовый онлайн-курс Мастерской управления «Сенеж» на платформе «Россия — страна возможностей». Ровно тот, что рекомендует область (слайд 11 презентации ВКС). Проходится за несколько часов, в конце — сертификат в личном кабинете.

Прошли все пятеро. Четыре сертификата с верными Ф.И.О. — 4 из 5 = 80 %, это твёрдый 1 балл. Нужен ещё **один**: четверо из пяти дают 1,5.

15.09 — организатор прислал итоговые формы

Четыре файла: справка проекта, карточка, шаблон итоговой презентации и оценочный лист заочного этапа. Сдавать три документа **до 01.10.2026** на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru — в теме письма название команды и телефон капитана. Презентация уже пересобрана на новом шаблоне.

⚠ Присланный **оценочный лист** — **устаревшая редакция**: в нём 8 критериев и 12 баллов, нет «актуальности» и «инцидент-менеджмента», и нигде не упомянуты органы местного самоуправления. Действует Приложение № 3 к распоряжению 99-р — 9 критериев, 17 баллов. Организатору отправлен запрос на подтверждение; до ответа считаемся по 99-р, но формулировки пишем так, чтобы читались по обеим редакциям.

Где мы сейчас

СЕГОДНЯ

1

2

3

4

● Старт проекта

22.07.2026 — 31.07.2026

22.07	✓ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды	участие команды
24.07	✓ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы	протокол/решение замов
30.07	✓ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа	команда «Лидеры перемен», 5 человек
июль	Распоряжение администрации об инициировании проекта	НПА · получено 17.09 на бланке, нужны визы и подпись
июль—авг.	Карточка проекта — содержание согласовано куратором 17.09	НПА · утверждает Глава округа

● Диагностика и целевое состояние

03.08.2026 — 04.09.2026

03–24.08	Сбор фактических данных о процессе	анкета замеров «как было»
до 23.09	Гемба и хронометраж процесса на месте	лист гембы, подписанный
✓ 17.09	Карта текущего состояния в draw.io	согласована куратором Ключниковым А.Ю. 17.09, правкам не подлежит
✓ 16.09	Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы	аналитика для слайда 4
до 26.09	Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления	фото «до» — потом этого уже не будет
01–03.09	Карта целевого состояния в draw.io	карта + согласование с куратором
03–04.09	План мероприятий по реализации проекта	НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица

● Реализация плана мероприятий

07.09.2026 — 23.09.2026

07.09	Совещание по защите подходов внедрения	протокол совещания
08–23.09	Внедрение мероприятий и фиксация результатов	записи в журнале проекта
до 26.09	Обезличенные экраны бота и панели	девять снимков с именами файлов — список в «Материалах»
до 23.09	Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук	требование Приложения № 5
сентябрь	Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09	подпись в последние дни — лотерея
весь этап	Сборка отчётной презентации по шаблону	презентация — Приложение № 5
весь этап	Обучение команды: пройдено всеми пятью, 1,5 балла взяты	сертификаты — критерий 2 конкурса

● Анализ результатов и закрытие **мы здесь**

24.09.2026 — 30.09.2026

24–25.09	Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов	замеры «как стало»
28.09	Карта достигнутого состояния в draw.io	карта без проблем и мероприятий
28–29.09	Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки	НПА · приказ Главы округа, без него нет балла
30.09	Отчёт о результатах, закрытие проекта	НПА · Приложение № 4, подписанный
30.09	Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат	цифры для справки и слайда 7

Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом. Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевают до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

Что делать на этой неделе

17 — 26 СЕНТЯБРЯ · ДО СДАЧИ 14 ДНЕЙ

Документы собраны, сверены машинно и лежат в репозитории. Осталось семь позиций, и **шесть из них может закрыть только человек** — этих данных нет ни в базе бота, ни в наших файлах.

☐ Завести инициативные группы в панели **до 22.09**

Роль staff тем, кто будет подавать заявки по итогам обхода территории. **Пока их нет, показатель «доля проблем, выявленных до обращения жителя» на замере даст ноль** — а это ядро проекта, ради него он и затеян. Задача с длинным плечом: людям нужно несколько дней, чтобы реально подать заявки. Делать сегодня.

☐ Запросить выгрузку из СЭД «Дело» **до 23.09**

Обращения граждан по благоустройству и ЖКХ **помесячно за январь-август 2026**. Это база **цели проекта** — снижения количества обращений — и объём процесса в расчёте экономического эффекта. Единственная позиция пакета, которую нельзя закрыть своими силами: бот считает заявки, обращения живут в СЭД. Идёт через чужие руки, поэтому тоже сегодня.

☐ **Подтвердить цифры листа гембы** [до 23.09](#)

Пройти по девяти этапам и сказать по каждому: столько-то минут, по опыту. Лист **предзаполнен реконструкцией** — цифры получены разложением длительностей карты, а не наблюдением, и в листе помечены серым курсивом. После вашего подтверждения это **экспертная оценка**, и её законно ставить в карточку и справку. До подтверждения — нельзя. Сказать «не восемь минут, а два» быстрее, чем вспоминать с нуля: полчаса работы, а закрывает два заявленных инструмента из десяти.

☒ **Распоряжение подписано** [24.09](#)

Распоряжение администрации округа от 24.09.2026 № 534-р. Обе правки внесены при подписании: и заголовок, и название проекта в пункте 1 и в приложении несут действующую редакцию, дословно как в карточке и справке. Подпись Главы Башуна А.А., печать «Для документов», зарегистрировано — вх. № 1589 от 25.09.2026. [↓ Скан, 2 стр.](#)

☒ **Карточка закрыта полностью** [27.09](#)

Красного в карточке больше нет. Подпись руководителя аппарата — **Башун Александр Александрович**. Базы показателей даны заказчиком: обращений **40 в месяц**, трудозатраты на регистрацию одного сообщения **15 минут**, доля заявок, исполненных в срок, — **60 %**. Из периметра убран «Общий»: направлений три — УДС, Благоустройство, ЖКХ.

☐ **Стоимость часа и стоимость выезда — запрос в бухгалтерию** [до 25.09](#)

Час рабочего времени специалиста и заместителя (годовой ФОТ с начислениями на норму 1 972 часа) и стоимость одного выезда бригады на объект. Без них не посчитать экономический эффект. Цифры внутренние, считает бухгалтерия или кадры.

☐ **Снять скриншоты и фотографии** [до 26.09](#)

Девять снимков на три слайда приложений: сервис глазами жителя, панель администрации, было и стало. **Точный список с именами файлов** — в разделе «Материалы» ниже. Главное правило: ни ФИО, ни телефона, ни аватара, ни текста реального обращения. Снимать свой диалог с ботом, а в панели — свою тестовую заявку.

Порядок, если времени в обрез. Пункты 1 и 2 — первыми и сегодня: у них длинное плечо, они упираются в чужое расписание. Остальные пять делаются за час каждый и терпят до выходных.

Замеры «как стало» — 24-25 сентября. Что это за файлы.

1. Выгрузка замеров — `замеры_как_стало.sql`. Это не программа и не изменение системы: просто список из двенадцати вопросов, на которые база отвечает цифрами. Только чтение, на боевой базе безопасно. Запустить **на стенде**, где стоит база — в облаке её нет. PowerShell, два шага:

```
docker cp .\замеры_как_стало.sql tp2_db:/tmp/z.sql
docker exec tp2_db psql -U radar -d radar -f /tmp/z.sql > замеры.txt
```

Появится файл `замеры.txt` с двенадцатью таблицами. **Его целиком прислать в чат** — цифры разложатся по строкам карточки, справки и презентации.

Не через < файл и не через `Get-Content | docker exec`: первого в PowerShell нет, второе портит кириллицу. [↓ Скачать выгрузку](#)

2. Расчёт экономического эффекта — [экономический_эффект.ру](#). Калькулятор: справка требует эффект в рублях за год, а это единственная цифра пакета, которую нельзя ни измерить, ни взять из документа — она считается. Запускать можно где угодно, где есть Python. **Но проще не запускать самому:** прислать четыре числа — объём обращений в месяц, стоимость часа специалиста и заместителя, стоимость выезда бригады, счета за сервисы и хостинг за год — и расчёт будет подставлен в справку вместе с формулировкой.

Пока эти величины не заполнены, скрипт показывает **637 200 ₽/год** — это **не результат, а пример устройства расчёта**: он тут же предупреждает об этом и завершается ошибкой, чтобы демонстрационная цифра не ушла в справку по недосмотру. [↓ Скачать расчёт](#)

Раньше 24.09 мерить нечего — сначала пункты 1 и 2 списка выше.

Карта согласована по структуре, но её цифры — пока реконструкция. Куратор согласовал этапы, последовательность, «ежи» и форму. Длительности этапов получены расчётом, а не наблюдением, и именно из них считается ВПП «10 — 44 дня» — а на него опираются карточка, справка, презентация и обе остальные карты.

Если на гембе окажется, что реальные цифры другие, поедет не только карта: пересчитается ВПП, а за ним три документа. Правится это одним местом — словарём длительностей в сборщике карты, дальше всё пересобирается скриптами. Но **делать это надо до замеров «как стало» 24-25.09**, иначе «было» и «стало» окажутся посчитаны по разным линейкам. Отсюда и срок гембы — до 23.09, раньше замеров.

Документы пакета

Распоряжение об инициировании проекта

На бланке администрации, получено 17.09 · дата, номер и визы проставляются при регистрации · подпись Главы округа [↓ PDF](#) [↓ Word](#)

в работе

Карточка проекта

Приложение № 1, форма МПК [↓ PDF](#) [↓ Word](#)

в работе

Карта текущего состояния

9 этапов, 12 проблем, ВПП 10–44 дн. · согласование с куратором [↓ PNG \(в работе\)](#)
[↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

в работе

Анализ проблем

Диаграмма Исикавы: 13 факторов по 5 категориям · «5 почему» до коренной причины · слайд 4 презентации [↓ PNG](#) [↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

готово

Карта целевого состояния

9 этапов, 12 мероприятий, ВПП 1–17 дн. · согласование с куратором [↓ PNG \(в работе\)](#)
[↓ исходник](#) [↓ редактор draw.io](#)

в работе

План мероприятий

Приложение № 3

не начато

Карта достигнутого состояния

Заготовка: этапы и таблица «было → стало» готовы, цифры расчётные до замеров

в работе

↓ PNG (в работе) ↓ исходник ↓ редактор draw.io

Отчёт о результатах

Приложение № 4

не начато

Стандарт процесса

регламент, даёт балл

не начато

Отчётная презентация

14 слайдов на итоговом шаблоне МПК · сверена с оценочным листом построчно, все девять критериев показаны · ждёт цифры замеров и скриншоты

↓ PPTX (в работе)

в работе

Речь защиты

доклад 10 мин + ответы 10 мин

не начато

Справка проекта

Приложение № 2 к 99-р · подпись Главы округа · один из трёх сдаваемых документов

↓ форма Word ↓ черновик Word (в работе)

в работе

Заявка на конкурс

подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · подписанный оригинал не выкладываем — у руководителя проекта

готово

Баллы конкурса

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

Доля обученных в команде

1 / 1,5

Масштабность проекта

1,5-2 / 2

Количество видов потерь

2 / 2

Источник проблематики

2 / 2

Стандартизация результатов

1 / 1

Соответствие формам

1 / 1

Цифровое решение

2 / 2

Актуальность

4 / 4


Реалистичный итог

16,5–17 из 17

Провал возможен ровно в одном месте — обучение. Масштабность вырастет до максимума, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС.

Считаем по Приложению № 3 к 99-р (9 критериев, 17 баллов). Присланный организатором лист — старая редакция на 12 баллов, запрос на подтверждение отправлен.

Проект уже работает

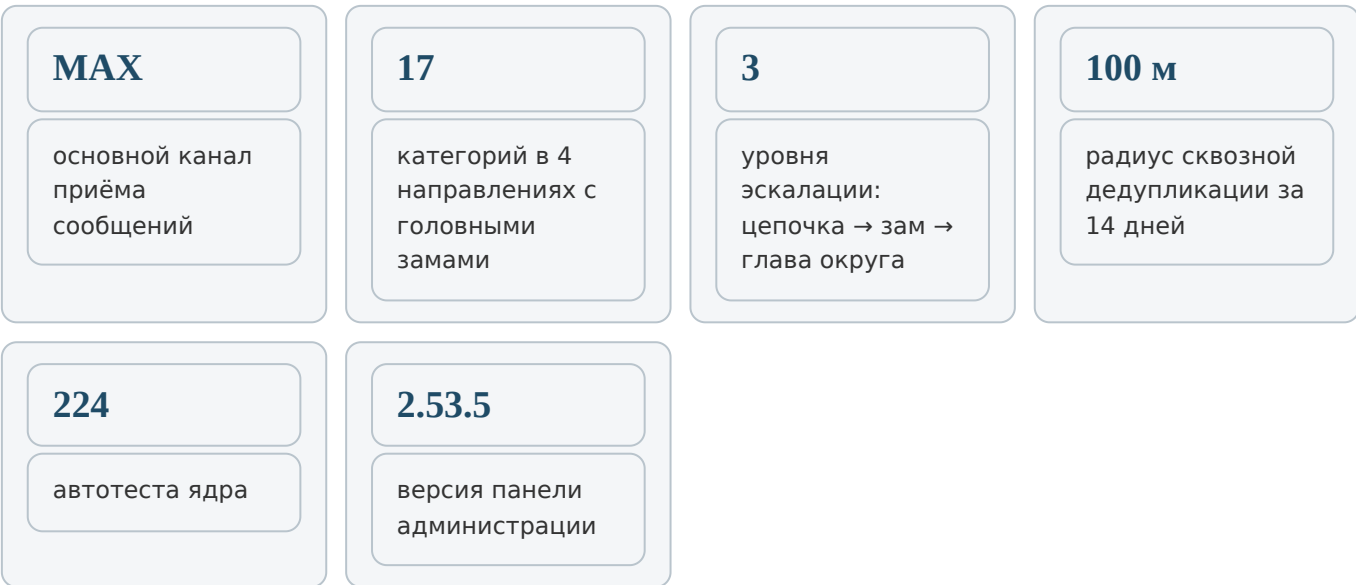

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2 , панель со статистикой и картой. Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

Команда проекта «Лидеры перемен»

СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

Уваров Геннадий Геннадьевич КАПИТАН КОМАНДЫ · РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА · ДОКЛАДЧИК	начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления	+7 914 608-57-79 · 77-10-27 fin_upr@blagraion.ru
Вихрова Анастасия Васильевна	директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»	телефон, почта
Воронцова Дарья Сергеевна	начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ	телефон, почта
Комчадалова Анна Александровна	начальник управления архитектуры и градостроительства	телефон, почта
Степаненко Анна Олеговна	советник главы администрации округа	телефон, почта

Состав менять нельзя. Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

Обучение закрыто: 4 сертификата из 5, порог взят. «Более 60 %» от пяти — это минимум четыре человека; у нас четыре с верными Ф.И.О. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

Заочный этап — максимум 17 баллов

1 Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

Градация: ≤2 инструмента — 0,5 · 3-4 — 1 · ≥5 — 1,5

Балл даётся не за список. В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

ИНСТРУМЕНТ	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Картирование процесса	три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого
Хронометраж	подписанный лист гембы
Гемба	тот же лист, отметки «видел сам»
«5 почему»	слайд 4 презентации
Диаграмма Исикавы	слайд 4 презентации
Голос клиента	оценка гражданина 1-5, статистика оценок
Визуализация	скриншоты дашборда и карты заявок
Канбан	скриншот доски заявок по статусам
Стандартизация	регламент процесса + памятки по ролям
Защита от ошибок	закрытие невозможно без фото; дедупликация

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

2 Доля обученных в команде

1,5 / 1,5

Градация: 10-40 % — 0,5 · 40-60 % — 1 · >60 % — 1,5

Единственное место, где можно провалиться. Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек. Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

Обучение прошли все пятеро (16.09.2026) — онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия — страна возможностей»).

Считаем по подтверждённым документам: 4 из 5, то есть 80 %. Четыре сертификата с верными Ф.И.О.: Уваров Г.Г., Вихрова А.В., Комчадалова А.А., Воронцова Д.С. Градация «более 60 %» взята с запасом — выше неё ничего нет.

Пятый сертификат считать нельзя. У Степаненко А.О. в поле фамилии напечатано «Анна»: в профиле РСВ фамилия заполнена неверно, документ читается как «Анна Анна Олеговна». Комиссия сверяет Ф.И.О. с заявкой, где стоит «Степаненко Анна Олеговна». Балл это не меняет — 1,5 уже есть по четырём. Но к справке такой сертификат лучше не прикладывать, пока профиль не исправлен.

Курс подходит, вопрос снят. Слайд 11 презентации ВКС «Обучение команд» даёт **два равноправных способа**: онлайн — базовый курс на платформе «Россия — страна возможностей» (ссылка и QR прямо на слайде), офлайн — практическое обучение на базе АНО ДПО «АЦОПП». Слайд 6 формулирует прямо: «обучение команды проекта **(онлайн и/или оффлайн)**». «Сенеж» — это платформа РСВ, то есть онлайн-вариант со слайда. Оставшихся записывать по той же ссылке.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет.

Отложить нельзя, ускорить нельзя. Но цена вопроса упала: теперь на кону не 1,5 балла, а 0,5.

3 Масштабность проекта

1,5 → 2 / 2

Градация: одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · межведомственное взаимодействие — 2

1,5 балла есть безусловно: процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие. Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт. Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и отработке сообщений не участвует.

Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

4 Количество видов потерь

2 / 2

Градация: 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · >5 — 2

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

Названия не менять. Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

5 Источник проблематики

2 / 2

Градация: инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

6 Стандартизация результатов

1 / 1

Градация: разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт. Поэтому регламент процесса **утверждается приказом администрации** до закрытия проекта, срок 28–29.09.

Заготовка есть: памятки по ролям, которые уже раздаются панелью. Их надо поднять до муниципального регламента — это не написание с нуля.

7 Соответствие формам

1 / 1

Градация: соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

Карточка проекта	форма Приложения № 1, один лист А4, альбомная
Справка проекта	форма Приложения № 2 к 99-р, PDF
Презентация	структура Приложения № 5, порядок разделов не менять
Карты процесса	draw.io, условные обозначения из методрекомендаций
План мероприятий	Приложение № 3
Отчёт о результатах	Приложение № 4
Название проекта	дословно одинаково в приказе, карточке, заявке и справке

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

8 Цифровое решение

2 / 2

Градация: доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения — 2** · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Формулировать явно:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика.**

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

9 Актуальность проекта

4 / 4

Градация: высокая — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1

Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа. На что опираемся:

Предмет	благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день
Охват	27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было
Соответствие	клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей»
Федеральная практика	платформа обратной связи, ЦУР
Тиражируемость	процесс типовой для муниципальных образований области

Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.

Реалистичный итог: 16,5 — 17 из 17. Обучение команды закрыто — единственный критерий, который нельзя было нагнать в последнюю неделю, больше не риск. Осталось полбалла на масштабности: нужен ответ администрации, есть ли в цепочках исполнения сторонние организации. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы.

Очный этап весит 25 баллов против 17 заочных — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

1 Аргументация выбора темы

5

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходится с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

2 Клиентоориентированность

5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

3 Наглядный дополнительный материал

5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

Карты процесса на А3	три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются
Подписанный лист гембы	ответ на вопрос «откуда цифра ВПП»
Фото «до / после»	требование Приложения № 5, слайды 10–11
Скриншоты бота и панели	обезличенные, крупными фрагментами
Регламент процесса	распечатка утверждённого стандарта

4 Представление проекта

5

Соблюдение регламента прямо входит в критерий: доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

5 Качество доклада

5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили.

Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

Материалы: что снять и собрать

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Девять снимков с точными именами — под три слайда приложений. Сборщик презентации ищет файлы по именам и сам расставляет их по слайдам, сохраняя пропорции; чего нет — на слайде остаётся пунктирная заглушка с подписью, что именно снять. Класть в Team28/08_презентация/материалы/, формат PNG, не пережимать в JPEG — текст на скриншоте должен читаться с проектора.

Слайд «Сервис глазами жителя»: житель-1-подача.png — сообщение с фотографией и геометкой, бот принял заявку и дал номер; житель-2-статус.png — уведомление «взято в работу», исполнитель и срок; житель-3-результат.png — фотография «после» и кнопки оценки 1-5.

Слайд «Панель администрации»: панель-1-карта.png — карта заявок по округу; панель-2-статистика.png — сроки, нагрузка, направления; панель-3-карточка.png — карточка заявки с журналом событий и фото до/после.

Слайд «Было и стало»: было-1-журнал.png — журнал регистрации и письменные заявления; было-2-сэд.png — карточка обращения в СЭД «Дело»; стало-1-заявка.png — та же работа в новом процессе, заявка у исполнителя с готовой категорией, адресом и сроком.

Ни на одном снимке не должно быть ФИО, телефона, ника, аватара и текста реального обращения жителя. Снимать свой диалог с ботом, а в панели — свою тестовую заявку либо замазать колонку «Автор». Точки на карте обезличены сами по себе. Имя сотрудника администрации оставлять можно: это должностное лицо при исполнении, а не персональные данные гражданина.

Если времени мало, порядок такой: карта заявок, подача жителем, журнал регистрации, результат с оценкой. Первые два показывают охват и вход в процесс, третий — с чем сравниваем, четвёртый закрывает сразу два показателя карточки.

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

☐ **Обезличенные экраны бота** до 26.09

Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

☐ **Обезличенные экраны панели администрации** до 26.09

Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

☐ **Фото «после» — устранённые проблемы** до 23.09

Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

☐ **Фото «до» — те же объекты до устранения** до 23.09

Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3-5 пар.

☐ **Фото или схема прежнего рабочего процесса** до 26.09

Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24-31.08 — потом этого уже не будет.

☐ **Карты процесса на А3, три листа** до защиты

Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

☐ **Затраты на реализацию в рублях** до 24.09

Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 8 неполон.

☐ **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа** до 23.09

Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

☐ **Скриншот статистики за период пилота** 24-25.09

Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

Персональные данные не переносим. ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите:

один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

Правовые акты и подписи Главы округа

ЧУЖАЯ ПОДПИСЬ — ВСЕГДА УЗКОЕ МЕСТО

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

июль 2026 **Распоряжение об инициировании проекта**

✓ подписано
24.09.2026 № 534-р ·
зарегистрировано вх.
№ 1589

до 31.08 **Карточка проекта — утверждает Глава округа**

подпись руководителя
органа

03–04.09 **План мероприятий — подписывают руководитель
проекта и ответственное лицо**

Приложение № 3

28–29.09 **Приказ об утверждении регламента процесса**

без него критерий 6 не
засчитан

30.09 **Отчёт о результатах реализации проекта**

Приложение № 4 ·
состав подписантов
уточнить

Что в приказе об открытии обязано быть: название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх**.

Про регламент — не откладывать на 28.09. Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Разработанный, но не утверждённый приказом документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — это лотерея. Текст регламента готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

Открытый вопрос: нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

Файлы проекта

СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры или разделы ещё подставляются.

Карточка проекта Оформленная, один лист А4 · база показателей ждёт замеров	✓ файл есть, в работе	
Карточка проекта — форма Word Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей	✓ файл есть, в работе	
Распоряжение об инициировании — Word На бланке администрации. Три страницы: распоряжение, визы согласования, приложение с составом команды	✓ файл есть	
Распоряжение об инициировании — PDF То же для просмотра. Дата, номер и визы проставляются при регистрации	✓ файл есть	
Анкета замеров «как было» Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр	✓ файл есть	
Лист гембы Предзаполнен расчётом: 9 этапов, время разложено на чистое и ожидание, 12 «ежей» на проверку. 7 страниц А4 альбомной — печатать на планшет. Подписывать только после обхода	✓ файл есть	
Карта текущего состояния Девять этапов, 12 проблем, ВПП от 10 до 44 дней. Первый этап — «слепой период»: проблема есть, администрация о ней не знает	✓ файл есть, в работе	
Карта целевого состояния Как процесс должен выглядеть после внедрения: 9 этапов, 12 мероприятий, ВПП от 1 до 17 дней против 10–44 дней	✓ файл есть, в работе	
Карта достигнутого состояния Заготовка: ни проблем, ни мероприятий, внизу таблица «было → стало». Красным — то, что ещё не замерено	✓ файл есть, в работе	
Карта достигнутого — источник draw.io Правится в редакторе, PNG собирается из него	✓ файл есть	✓ файл есть
Карта целевого — источник draw.io Правится в редакторе, PNG собирается из него	✓ файл есть	✓ файл есть
Карта — источник draw.io Правится только здесь, PNG собирается из него. Скачать файл и открыть в редакторе: Файл → Открыть из → Устройство	✓ файл есть	✓ файл есть
Анкета: процедурный статус Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации	✓ файл есть	
Анкета: сроки конкурса Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи	✓ файл есть	
Самооценка по критериям конкурса Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается. Пересчёт под 17 баллов — в работе	✓ файл есть, в работе	

Анализ причин: Исикава и «5 почему»

Один лист: 13 факторов по пяти категориям и цепочка из пяти вопросов до коренной причины. Он же слайд 4 презентации

✓ файл есть

✓ файл есть

✓ файл есть

Анализ процесса «как было / как стало»

Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация

✓ файл есть, в работе

Отчётная презентация

Черновик на итоговом шаблоне МПК, 14 слайдов. Часть слайдов ждёт карту, цифры замеров и скриншоты

✓ файл есть, в работе

Сертификат об обучении — образец

Базовый онлайн-курс платформы РСВ. Критерий 2: обучены все пятеро, 4 сертификата с верными Ф.И.О. — 1,5 балла

✓ файл есть

Повестка и протокол совещания

Шаблон встречи команды: 8 пунктов, таблица решений, подписи. 4 страницы А4

✓ файл есть

Разбор тестов курса

30 вопросов с ответами и пояснениями — открывается страницей, не скачивается

✓ файл есть

Штаб — печатная форма

Снимок этой страницы на 17 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой вверх

✓ файл есть

Шаблон итоговой презентации

Официальный файл организатора от 15.09.2026 — то, на чём собрана наша презентация

✓ файл есть

Справка проекта — черновик

Заполнена в официальной форме. Критерии 1–3 готовы, результаты и экономический эффект ждут замеров

✓ файл есть, в работе

✓ файл есть, в работе

Справка проекта — форма

Приложение № 2 к 99-р. Заполняется и подписывается Главой округа

✓ файл есть

Карточка проекта — итоговая форма

Присланная 15.09. Состав полей прежний, добавлен блок трёх подписей, включая куратора

✓ файл есть

Оценочный лист заочного этапа

⚠ Присланная редакция: 8 критериев и 12 баллов. Считаемся по Приложению № 3 к 99-р — 9 критериев, 17 баллов

✓ файл есть, в работе

Заявка на конкурс

Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта

файла ещё нет

Распоряжение — подписанное и зарегистрированное

От 24.09.2026 № 534-р. Подпись Главы, печать, вх. № 1589 от 25.09.2026. Это и есть копия для пакета

✓ файл есть

Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: nicegenn.github.io/Team-28-progress

После закрытия проекта

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ

до 01.10.2026	Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса	на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru
III кв. 2026	Защита проекта на Проектном комитете области	дату уточнить у куратора
IV кв. 2026	Презентация результатов на рабочих совещаниях Губернатора	по вызову
до 28.12.2026	Выплаты победителям и призёрам конкурса «Команда-28»	если попадаем в призы

Справка проекта — что это. Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта, период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

Когда делать. Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09–01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- ☐ **Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии** — процедурный статус
- ☐ **В каком порядке принимают карточку и приказ.** Положение: карточка → согласование МПК → приказ после уведомления. Презентация ВКС, слайд 6: карточка → приказ → направить куратору комплектом. Ответ решает, готовить ли оба документа сразу
- ☒ **Кто владелец процесса** — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа
- ☒ **Должность руководителя проекта** — закрыто заявкой 27.08

- ☒ Название команды и её состав — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек
- ☐ Есть ли в цепочках сторонние организации — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- ☒ Кто назначен куратором проекта — закрыто 16.09: Ключников Александр Юрьевич. Контакт у руководителя проекта. Нужен для согласования карты и третьей подписи в карточке
- ☐ Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы
- ☒ Засчитывается ли обучение «Сенежа» — закрыто 30.08: слайд 11 ВКС даёт онлайн (РСВ) и офлайн (АЦОПП) как равноправные
- ☐ Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- ☐ Численность жителей округа и число населённых пунктов
- ☐ Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- ☒ Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа

Заметки

ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.

Рабочая копия участника проекта. Отметки на бумаге в общую версию не попадают — вносите их в Штаб или передайте руководителю проекта.
Документы и черновики — в репозитории NiceGenn/Team-28.
