

Бережливое управление · «Эффективный регион» · Команда-28

Оптимизация приёма и отработки сообщений граждан

Благовещенский муниципальный округ. Предмет проекта — процесс приёма, маршрутизации и контроля исполнения сообщений о проблемах благоустройства и жизнеобеспечения. Бот «Точка перемен» — внедрённое мероприятие.

ПЕРИОД ПРОЕКТА
22.07 — 30.09.2026

ДО ЗАКРЫТИЯ
34 дня


ДО СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
35 дней

ПРИКАЗ
статус уточняется

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
подана 30.07, в срок

КОМАНДА
«Лидеры перемен», 5 человек

Где мы сейчас



● **Старт проекта**

22.07.2026 — 31.07.2026

22.07	✓ Стартовый вебинар «Эффективного региона» — начало работы команды	участие команды
24.07	✓ Таксономия направлений и категорий утверждена заместителями главы	протокол/решение замов
30.07	✓ Заявка на конкурс «Команда-28» подана и подписана Главой округа	команда «Лидеры перемен», 5 человек
июль	Приказ администрации об открытии проекта	НПА · статус уточняется, см. ниже
июль–авг.	Карточка проекта — в МПК на согласование	НПА · утверждает Глава округа

● **Диагностика и целевое состояние** **мы здесь**

03.08.2026 — 04.09.2026

03–24.08	Сбор фактических данных о процессе	анкета замеров «как было»
24–31.08	Гемба и хронометраж процесса на месте	лист гембы, подписанный
24–31.08	Карта текущего состояния в draw.io	карта + согласование с куратором
до 31.08	Реестр потерь, «5 почему», диаграмма Исикавы	аналитика для слайда 4
24–31.08	Снять прежний рабочий процесс: журнал, стол приёмной, заявления	фото «до» — потом этого уже не будет
01–03.09	Карта целевого состояния в draw.io	карта + согласование с куратором
03–04.09	План мероприятий по реализации проекта	НПА · подписи руководителя проекта и ответственного лица

● Реализация плана мероприятий

07.09.2026 — 23.09.2026

07.09	Совещание по защите подходов внедрения	протокол совещания
08–23.09	Внедрение мероприятий и фиксация результатов	записи в журнале проекта
до 15.09	Обезличенные экраны бота и панели	скриншоты для слайдов 8–10
до 23.09	Пары фото «до / после» по одному адресу, 3–5 штук	требование Приложения № 5
сентябрь	Текст регламента процесса — готовить заранее, не 28.09	подпись в последние дни — лотерея
весь этап	Сборка отчётной презентации по шаблону	презентация — Приложение № 5
весь этап	Обучение команды, сбор сертификатов	сертификаты — критерий 2 конкурса

● Анализ результатов и закрытие

24.09.2026 — 30.09.2026

24–25.09	Повторный хронометраж, мониторинг достигнутых результатов	замеры «как стало»
28.09	Карта достигнутого состояния в draw.io	карта без проблем и мероприятий
28–29.09	Стандарт улучшенного процесса — регламент и памятки	НПА · приказ Главы округа, без него нет балла
30.09	Отчёт о результатах, закрытие проекта	НПА · Приложение № 4, подписанный
30.09	Расчёт экономического эффекта ₽/год и затрат	цифры для справки и слайда 7

Процедурный статус под вопросом — выяснить первым делом. Со слов руководителя проекта, кроме заявки на конкурс Организатору и в МПК **ничего не направлялось**. По Положению процедура запускается с карточки: МПК рассматривает её 10 рабочих дней → уведомление о согласовании 5 р.д. → приказ об открытии в течение 5 р.д. после уведомления. Если карточка не подавалась, это **до трёх недель сверху**, и в срок до 30.09 они помещаются только при параллельном ведении работ. Уточнить у куратора, в каком статусе процедура и надо ли подавать карточку сейчас.

Период отсчитан от стартового вебинара 22.07.2026. Два месяца восемь дней: закрытие успевает до сдачи материалов 01.10 и попадает в III квартал — окно защиты. Растянуть период нельзя: за 30.09 проект не закрыт, и справку проекта заполнять не из чего. Обратная сторона — срок ниже ориентира «6 ± 2 месяца» из тренинга; на защите ответ готов: значительная часть мероприятий внедрена в ходе пилота, параллельно с диагностикой. **После получения копии приказа даты сверить** и, если расходятся, поправить в строках выше.

Что делать на этой неделе

24 — 31 АВГУСТА

☐ Договориться с куратором о согласовании карты **НУЖЕН КУРАТОР**

Карта текущего состояния подлежит обязательному согласованию лично или по ВКС. Это единственное, что нельзя сделать в последний день — встречу назначают заранее.

- ☐ **Раздать анкету замеров «как было»** НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
 Каналы приёма, число сообщений в месяц, журнал регистрации, доля повторных обращений. Самая долгая работа: зависит не от нас. Печатать по числу опрашиваемых, разделы А-З. ↓ **Анкета, 3 стр.**
- ☐ **Хронометраж: замерить операции процесса** НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
 Сколько минут занимали регистрация одного сообщения, поиск ответственного, передача поручения. Без этих цифр эффект проекта недоказуем — и сам хронометраж идёт в зачёт как инструмент. Таблица — раздел В анкеты. ↓ **Анкета, разд. В**
- ☐ **Гемба: посмотреть процесс на месте**
 Фиксируем только то, что видим. Ищем несовершенство в процессе, а не в людях. Лист гембы — 6 страниц А4 альбомной, 42 замера по 10 этапам, печатать на планшет.
 ↓ **Лист гембы**
- ☐ **Карта текущего состояния в draw.io**
 Условные обозначения из методики. ВПП — парой «минимум — максимум». Проблемы нумеруются и собираются в список. Каркас готов — после замеров подставляем цифры и переекспортируем. ↓ **Исходник draw.io** ↓ **Текущий вид (в работе)**
- ☐ **Реестр потерь и «5 почему»**
 Восемь видов потерь официальными названиями — это 2 балла из 2. Корневые причины нужны для слайда 4 презентации.
- ☐ **Получить копию приказа** НУЖНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 Точные даты, название проекта дословно, состав команды. Копия приказа — обязательный документ пакета на защиту. Что именно спросить — в анкете о процедурном статусе.
 ↓ **Анкета: статус**
- ☐ **Карточка проекта на подпись**
 Заполнена целиком: заказчик, владелец, руководитель, команда. Базовые значения показателей — с оговоркой «уточняются в рамках хронометража», методика это разрешает. Две версии: строгая по форме Word (с подписями) и оформленная по образцу области. ↓ **Оформленная, PDF** ↓ **Форма Word**
- ☐ **Записать четверых из пяти на обучение** СРОЧНО
 Команда «Лидеры перемен», 5 человек — для 1,5 балла нужны сертификаты у четверых. Единственный критерий, где можно провалиться, и быстрее это не станет.

Порядок важен. Замеры и согласование с куратором запускаются первыми: они упираются в чужое расписание. Карту, реестр потерь и «5 почему» можно делать параллельно — они зависят только от нас.

Документы пакета

Приказ об открытии проекта
статус уточняется

не начато

Карточка проекта Приложение № 1, форма МПК ↓ PDF ↓ Word	в работе
Карта текущего состояния draw.io, согласование с куратором ↓ PNG (в работе) ↓ исходник	не начато
Анализ проблем «5 почему», Исикава, реестр потерь	не начато
Карта целевого состояния draw.io	не начато
План мероприятий Приложение № 3	не начато
Карта достигнутого состояния без проблем и мероприятий	не начато
Отчёт о результатах Приложение № 4	не начато
Стандарт процесса регламент, даёт балл	не начато
Отчётная презентация 7 слайдов, ждём шаблон ↓ PPTX (в работе)	не начато
Речь защиты доклад 10 мин + ответы 10 мин	не начато
Справка проекта Приложение № 2 к 99-р · pdf · делается последней, 30.09—01.10	не начато
Заявка на конкурс подана 30.07.2026 · «Лидеры перемен», 5 человек · подписанный оригинал не выкладываем — у руководителя проекта	готово


Баллы конкурса	ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
Инструменты бережливого управления	1,5 / 1,5
Доля обученных в команде	? / 1,5
Масштабность проекта	1,5-2 / 2
Количество видов потерь	2 / 2
Источник проблематики	2 / 2
Стандартизация результатов	1 / 1
Соответствие формам	1 / 1

Реалистичный итог

15,5–16 из 16

Провал возможен ровно в одном месте — обучение. Масштабность вырастет до максимума, если в цепочках исполнения есть сторонние организации: подрядчики, ресурсоснабжающие, ЕДДС.

Проект уже работает

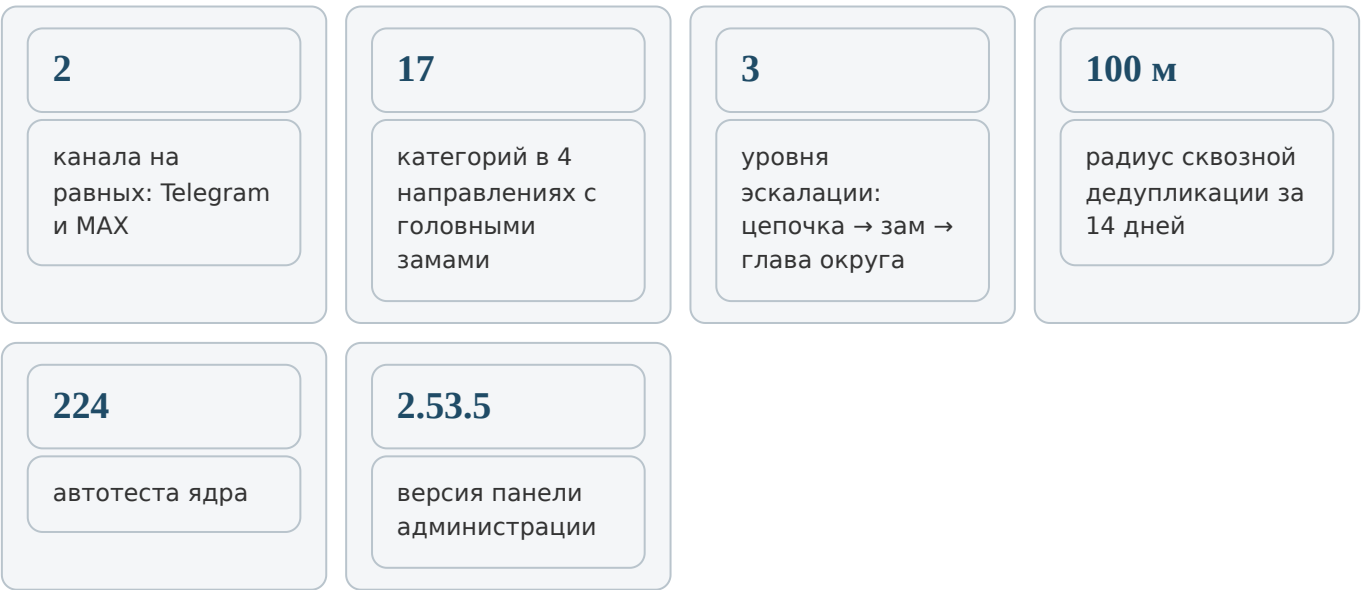

ИИ-классификация, каскад геопривязки, SLA-таймеры с автоэскалацией, доказательное закрытие с фото и оценкой гражданина, автовозврат в работу при оценке ≤ 2 , панель со статистикой и картой. Показатели «как стало» выгружаются из системы в любой момент — считать нечего, они уже считаются.

Команда проекта «Лидеры перемен»

СОСТАВ ИЗ ЗАЯВКИ ОТ 30.07.2026

Уваров Геннадий Геннадьевич КАПИТАН КОМАНДЫ · РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА · ДОКЛАДЧИК	начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления	+7 914 608-57-79 · 77-10-27 fin_upr@blagraion.ru
Вихрова Анастасия Васильевна	директор МБУ «Информационный центр Благовещенского муниципального округа»	телефон, почта
Воронцова Дарья Сергеевна	начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ	телефон, почта

**Комчадалова Анна
Александровна**

начальник отдела муниципального
контроля

телефон, почта

Степаненко Анна Олеговна

советник главы администрации
округа

телефон, почта

Состав менять нельзя. Он должен совпадать дословно в четырёх местах: заявка → приказ об открытии → карточка проекта → справка проекта. Расхождение хотя бы в одной фамилии — вопрос комиссии и минус по критерию «соответствие формам».

Обучение: нужны сертификаты у четверых из пяти. «Более 60 %» от пяти — это минимум четыре человека; трое дают ровно 60 % и порог не берут. Один участник может остаться без сертификата без потери балла.

Самооценка по критериям конкурса

Основание — распоряжение Губернатора № 99-р от 13.07.2026, Приложения № 3 и № 4. Баллы заочного этапа комиссия выставляет **по справке проекта**, а справка пишется 30.09 — 01.10, в один день с закрытием. Здесь заранее разложено, за что мы претендуем на балл, из чего он берётся и чем подтверждается — чтобы в этот день справка собиралась копированием, а не написанием.

Заочный этап — максимум 16 баллов

1 Инструменты бережливого управления

1,5 / 1,5

Градация: ≤2 инструмента — 0,5 · 3-4 — 1 · ≥5 — 1,5

Балл даётся не за список. В формулировке критерия стоит «с обоснованием выбора и оценкой влияния на результат». Перечисление из десяти слов даст 0,5. По каждому инструменту пишем три вещи: где применён — зачем выбран — что изменилось.

ИНСТРУМЕНТ

ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Картирование процесса	три карты draw.io: текущего, целевого, достигнутого
-----------------------	---

Хронометраж	подписанный лист гембы
-------------	------------------------

Гемба	тот же лист, отметки «видел сам»
-------	----------------------------------

«5 почему»	слайд 4 презентации
------------	---------------------

Диаграмма Исикавы	слайд 4 презентации
-------------------	---------------------

Голос клиента	оценка гражданина 1-5, статистика оценок
---------------	--

Визуализация	скриншоты дашборда и карты заявок
--------------	-----------------------------------

Канбан	скриншот доски заявок по статусам
--------	-----------------------------------

Стандартизация

регламент процесса + памятки по ролям

Защита от ошибок

закрытие невозможно без фото; дедупликация

Десять инструментов при пороге в пять — запас двукратный.

2 Доля обученных в команде

? / 1,5

Градация: 10–40 % — 0,5 · 40–60 % — 1 · >60 % — 1,5

Единственное место, где можно провалиться. Считается доля конкурсантов команды с сертификатом об обучении основам бережливого управления.

Состав известен из заявки: «Лидеры перемен», 5 человек. Значит для 1,5 балла нужны сертификаты у **четверых**: «более 60 %» от пяти — это минимум четыре. Трое дают ровно 60 % и не проходят.

Кого учить — решать вам, но логика простая: капитан обязательно плюс трое из четверых. Один человек может остаться без сертификата без потери балла.

Всё остальное в проекте зависит от нас и делается за вечер. Обучение — внешний срок: курс идёт столько, сколько идёт, и к 01.10 сертификат либо есть, либо нет.

Отложить нельзя, ускорить нельзя. Потеря при провале: 1,5 балла, итог 14–14,5.

3 Масштабность проекта

1,5 → 2 / 2

Градация: одно подразделение — 1 · несколько подразделений — 1,5 · межведомственное взаимодействие — 2

1,5 балла есть безусловно: процесс проходит через подразделение приёма сообщений, четыре направления с головными заместителями, их подразделения-исполнители и Главу округа.

Для 2 баллов нужно межведомственное взаимодействие. Есть ли в цепочках исполнения сторонние организации — подрядные, ресурсоснабжающие, управляющие компании, ЕДДС? Если да, их надо явно назвать в периметре в карточке и в справке.

МБУ «Информационный центр» в периметр не идёт. Его директор входит в команду, но само учреждение в приёме и обработке сообщений не участвует. Участие человека в команде не равно участию организации в процессе — в справке это не заявляем.

Самые дешёвые полбалла в списке: не требуют работы, только ответа администрации.

4 Количество видов потерь

2 / 2

Градация: 1–2 вида — 0,5 · 3–5 — 1,5 · >5 — 2

У нас **8 из 8** — вся официальная классификация, в официальном порядке и официальными названиями: перепроизводство · лишние движения · ненужная транспортировка · излишние запасы · избыточная обработка · ожидание · переделка и брак · неиспользование человеческого потенциала.

Названия не менять. Комиссия сверяет по знакомому списку из тренинга: «потеря времени» вместо «ожидание» читается как другой, незачтённый пункт.

Каждая потеря должна подтверждаться наблюдением на гембе. Неподтверждённую вычёркиваем: восемь заявленных и три доказанных хуже, чем шесть доказанных.

5 Источник проблематики

2 / 2

Градация: инцидент-менеджмент (массовые жалобы граждан) — 2 · внутренняя и внешняя обратная связь — 1 · реестр процессов — 1 · межведомственное взаимодействие — 1 · ничего — 0

Наш случай — ровно первый пункт. **Формулировка обязана звучать дословно:**

Источник проблематики: **инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа.**

В примере защищённого проекта Госжилинспекции написано просто «обращения граждан» — это читается как «внешняя обратная связь» и стоит **1 балл вместо 2**. Разница в одном слове.

6 Стандартизация результатов

1 / 1

Градация: разработан и **применяется** стандарт, регламент, инструкция или алгоритм — 1 · нет — 0

Ключевое слово — «применяется». Разработанный, но не введённый в действие документ балла не даёт. Поэтому регламент процесса **утверждается приказом администрации** до закрытия проекта, срок 28-29.09.

Заготовка есть: памятки по ролям, которые уже раздаются панелью. Их надо поднять до муниципального регламента — это не написание с нуля.

7 Соответствие формам

1 / 1

Градация: соответствуют — 1 · нет — 0

Балл технический, но теряется по невнимательности. Сверка перед отправкой:

Карточка проекта	форма Приложения № 1, один лист A4, альбомная
Справка проекта	форма Приложения № 2 к 99-р, PDF
Презентация	структура Приложения № 5, порядок разделов не менять
Карты процесса	draw.io, условные обозначения из методрекомендаций

План мероприятий Приложение № 3

Отчёт о результатах Приложение № 4

Название проекта **дословно одинаково** в приказе, карточке, заявке и справке

Последняя строка — самый частый провал: название, набранное заново в каждом документе, расходится в падеже или в порядке слов.

8 Цифровое решение

2 / 2

Градация: доработка имеющегося решения своими силами — 1 · **собственная разработка нового цифрового решения — 2** · разработка сторонним заказчиком — 1 · Яндекс-форма — 0,5

Наш случай — верхняя градация. Формулировать явно:

Собственная разработка нового цифрового решения — мультиканальный сервис приёма сообщений «Точка перемен»: два канала, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации. Разработано силами администрации округа, **без привлечения стороннего подрядчика**.

Последние четыре слова — то, что отделяет 2 балла от 1. Их надо написать.

9 Актуальность проекта

4 / 4

Градация: высокая — 4 · средняя — 3 · низкая — 2 · нет значимого эффекта — 1

Самый весомый критерий: четверть всех баллов заочного этапа. На что опираемся:

Предмет	благоустройство и жизнеобеспечение — то, что жители видят каждый день
Охват	27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было
Соответствие	клиентоцентричность, федеральный проект «Государство для людей»
Федеральная практика	платформа обратной связи, ЦУР
Тиражируемость	процесс типовой для муниципальных образований области

Численность жителей округа усилит аргумент — цифру стоит получить.

Реалистичный итог: 15,5 — 16 из 16. Провал возможен ровно в одном месте — обучение команды. В очный этап проходят первые 10 мест сводного рейтинга; при

равенстве баллов выше тот, кто подал заявку раньше — наша от 30.07, окно приёма 20–31.07.

Очный этап — максимум 25 баллов

Пять критериев по 5-балльной шкале. Оцениваются **доклад и докладчик**, а не документы.

Очный этап весит 25 баллов против 16 заочных — документы открывают дверь, но выигрывает доклад. Репетиции начинать не позднее середины сентября.

1 Аргументация выбора темы

5

Почему именно этот процесс: массовость обращений, повторные обращения об одной проблеме, отсутствие контроля сроков. Опереться на чек-лист разграничения «проект или предложение по улучшению» — он проходится с большим запасом, и это хороший аргумент в докладе.

2 Клиентоориентированность

5

Результат для жителя: проблема устранена и он об этом уведомлён. Показать замкнутый контур: оценка гражданина ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу. Это редкий случай, когда обратная связь не собирается «для галочки», а управляет процессом.

3 Наглядный дополнительный материал

5

Критерий прямо называет: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал**. То есть на защиту можно и нужно нести не только слайды.

Карты процесса на АЗ	три листа в руки комиссии — со слайда они не читаются
----------------------	---

Подписанный лист гембы	ответ на вопрос «откуда цифра ВПП»
------------------------	------------------------------------

Фото «до / после»	требование Приложения № 5, слайд 7
-------------------	------------------------------------

Скриншоты бота и панели	обезличенные, крупными фрагментами
-------------------------	------------------------------------

Регламент процесса	распечатка утверждённого стандарта
--------------------	------------------------------------

4 Представление проекта

5

Соблюдение регламента прямо входит в критерий: доклад не более 10 минут, ответы не более 10 минут. Прогон с секундомером обязателен — на бумаге десять минут и вслух десять минут это разные объёмы текста.

Плюс банк из примерно 20 вероятных вопросов с готовыми ответами.

5 Качество доклада

5

Композиция: проблема → потери → что сделали → цифры → что закрепили.

Убеждённость строится на том, что система уже работает, а не проектируется: это

наше главное отличие от большинства защищаемых проектов.

Материалы: что снять и собрать

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОДЕЛАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Приложение № 5 требует на слайде результатов **фото «до» и «после»** и примеры внедрённых изменений **с указанием затрат**. Очный критерий 3 прямо называет допустимые формы: **презентация, схемы, таблицы, раздаточный материал** — то есть на защиту можно нести не только слайды. Всё это снимается заранее: «до» уже почти невозможно снять, процесс изменился.

☐ **Обезличенные экраны бота**

до 15.09

Приём сообщения с фото и геометкой, карточка заявки у исполнителя, уведомление гражданину «до / после» с оценкой. Крупными фрагментами, не экран целиком — с проектора мелочь не читается.

☐ **Обезличенные экраны панели администрации**

до 15.09

Дашборд с дельтами, SLA-разрез, карта заявок, канбан-доска, статистика по направлениям. Это доказательная база сразу по трём инструментам: визуализация, канбан, голос клиента.

☐ **Фото «после» — устранённые проблемы**

до 23.09

Ямы, освещение, контейнерные площадки, спил деревьев по закрытым заявкам. Берутся из фотоотчётов исполнителей в системе — они там уже есть.

☐ **Фото «до» — те же объекты до устранения**

до 23.09

Из фото, приложенных гражданами к заявкам. **Пара «до / после» по одному адресу** — самый сильный слайд во всей презентации. Отобрать 3-5 пар.

☐ **Фото или схема прежнего рабочего процесса**

24-31.08

Как принимали сообщения раньше: журнал регистрации, стол приёмной, телефон, стопка письменных заявлений. Снять на гембе 24-31.08 — потом этого уже не будет.

☐ **Карты процесса на А3, три листа**

до защиты

Текущее, целевое, достигнутое состояние. В руки комиссии: со слайда карта читается только по форме, детали — с бумаги.

☐ **Затраты на реализацию в рублях**

до 24.09

Требуются прямо: «примеры внедрённых изменений с указанием затрат». Считаем расход платных API, хостинг, рабочее время. Без цифры слайд 7 неполон.

☐ **Публикация о проекте в СМИ или соцсетях округа** до 23.09
Строка в таблице дополнительной информации на последнем слайде. Сейчас пусто.

☐ **Скриншот статистики за период пилота** 24-25.09
Срез «как стало» на дату подготовки отчёта: время реакции, доля закрытых в срок, средняя оценка. Снимается на стенде — в облаке живой базы нет.

Персональные данные не переносим. ФИО, телефоны и тексты обращений с экранов убираем, примеры обезличиваем. Это требование 152-ФЗ и отдельный риск на защите: один нескрытый номер телефона на слайде перечёркивает аккуратность всего пакета.

Правовые акты и подписи Главы округа **чужая подпись — всегда узкое место**

Пять документов проекта не считаются готовыми без подписи. Три из них подписывает или утверждает **Глава округа**, один — руководитель проекта вместе с ответственным лицом, по отчёту состав подписантов уточняется. Каждая подпись — внешняя зависимость: её нельзя ускорить, а без неё документ не существует. Отдельно: Приложение № 5 требует на слайде результатов **перечень разработанных правовых актов** — этот список и есть ответ.

июль 2026	Приказ (распоряжение) об открытии проекта	издан, нужна копия
до 31.08	Карточка проекта — утверждает Глава округа	подпись руководителя органа
03–04.09	План мероприятий — подписывают руководитель проекта и ответственное лицо	Приложение № 3
28–29.09	Приказ об утверждении регламента процесса	без него критерий 6 не засчитан
30.09	Отчёт о результатах реализации проекта	Приложение № 4 · состав подписантов уточнить

Что в приказе об открытии обязано быть: название проекта, сроки реализации (начало и окончание), состав команды проекта. По нему сверяются карточка, заявка и справка — **название должно совпадать дословно во всех четырёх.**

Про регламент — не откладывать на 28.09. Критерий 6 требует, чтобы стандарт был «разработан **и применяется**». Разработанный, но не утверждённый приказом документ балла не даёт, а подпись в последние два дня проекта — это лотерея. Текст регламента готовить в сентябре, на подпись заносить заранее.

Открытый вопрос: нужен ли отдельный муниципальный правовой акт, закрепляющий

сам сервис приёма сообщений — положение о канале, политика обработки персональных данных. Для конкурса не обязателен, но усиливает и стандартизацию, и актуальность. Уточнить у Главы округа.

Файлы проекта

СКАЧАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Всё, что уже собрано, — одним списком. Документы в работе тоже здесь: лучше увидеть черновик и сказать, что не так, чем ждать готового. Пометка **в работе** значит, что цифры или разделы ещё подставляются.

Карточка проекта

Оформленная, один лист А4 · база показателей ждёт замеров

✓ файл есть, в работе

Карточка проекта — форма Word

Строгая официальная форма, Приложение № 1, с блоком подписей

✓ файл есть, в работе

Анкета замеров «как было»

Раздать сотрудникам: каналы приёма, журнал, хронометраж, ВПП, периметр

✓ файл есть

Лист гембы

6 страниц А4 альбомной, 42 замера по 10 этапам — печатать на планшет

✓ файл есть

Карта текущего состояния

Каркас на 10 этапов. Длительности подставляются после хронометража

✓ файл есть, в работе

Карта — источник draw.io

Открывать на app.diagrams.net. Правится только здесь, PNG экспортируется из него

✓ файл есть

Анкета: процедурный статус

Что направлено в МПК, издан ли приказ, кто куратор — вопросы администрации

✓ файл есть

Анкета: сроки конкурса

Дата Проектного комитета, когда направлять материалы, форма подачи

✓ файл есть

Самооценка по критериям конкурса

Все 9 заочных и 5 очных критериев: наш балл, чем подтверждается

✓ файл есть, в работе

Анализ процесса «как было / как стало»

Разбор процесса, на нём стоят карточка, карта и презентация

✓ файл есть, в работе

Отчётная презентация

Черновик: часть слайдов ждёт карту, цифры замеров и скриншоты

✓ файл есть, в работе

Штаб — печатная форма

Снимок этой страницы на 15 страницах А4. Свежую печатайте кнопкой сверху

✓ файл есть

Заявка на конкурс

Подписанный оригинал на публичной странице не выкладываем — запросить у руководителя проекта

файла ещё нет

Приказ об открытии проекта

Копии у нас нет: запрошена у администрации

файла ещё нет

Файлы обновляются вместе со страницей. Если открыли давно — обновите вкладку, браузер мог показать старую версию. Сами файлы — на странице Штаба, раздел «Файлы проекта»: nicegenn.github.io/Team-28-progress

После закрытия проекта

В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ВХОДИТ, НО СРОКИ ЖЁСТКИЕ

до 01.10.2026	Справка проекта + отчётная презентация — Организатору конкурса	на aksenova.aa@mpk.amurobl.ru
III кв. 2026	Защита проекта на Проектном комитете области	дату уточнить у куратора
IV кв. 2026	Презентация результатов на рабочих совещаниях Губернатора	по вызову
до 28.12.2026	Выплаты победителям и призёрам конкурса «Команда-28»	если попадаем в призы

Справка проекта — что это. Приложение № 2 к распоряжению 99-р, отдельный документ конкурса на две страницы, в формате PDF. Не путать с карточкой и с отчётом: карточка — это план в начале, отчёт — это результат по форме Положения, справка — выжимка для конкурсной комиссии.

В ней: **наименование проекта, период реализации** — дата начала и дата закрытия, и пять пунктов: цели с указанием проблем · выявленные потери · применённые инструменты бережливого управления · достигнутые результаты · экономический эффект ₽/год при наличии. **Приложения к справке:** карточка проекта и копия отчётной презентации.

Когда делать. Заполняется **последней, после закрытия проекта 30.09** — раньше нечего писать в графы «дата закрытия» и «достигнутые результаты». Практически: 30.09 подписан отчёт, 30.09–01.10 справка собирается из готового и уходит вместе с презентацией. Отдельной работы почти нет — все пять пунктов к этому моменту уже написаны в других документах. **Но именно по справке выставляются баллы заочного этапа**, поэтому формулировки в неё переносим дословно из карточки и отчёта, а не пересказываем.

Что уточнить

ОТМЕЧАЙТЕ ПО МЕРЕ ОТВЕТОВ

- ☐ Направлялась ли карточка проекта в МПК и издан ли приказ об открытии — процедурный статус
- ☒ Кто владелец процесса — закрыто 27.08: Башун А.А., глава округа
- ☒ Должность руководителя проекта — закрыто заявкой 27.08
- ☒ Название команды и её состав — закрыто: «Лидеры перемен», 5 человек

- ☐ Есть ли в цепочках сторонние организации — подрядчики, РСО, УК, ЕДДС
- ☐ Кто назначен куратором проекта от МПК или АЦОПП
- ☐ Дата заседания Проектного комитета и когда направлять материалы
- ☐ Сертификаты об обучении — нужны у четверых из пяти
- ☐ Шаблон презентации: цвета, шрифты, соотношение сторон
- ☐ Численность жителей округа и число населённых пунктов
- ☐ Затраты на реализацию в рублях — требуются на слайде результатов
- ☒ Трактовка термина «заказчик процесса» — закрыто 27.08: администрация округа

Заметки

ПИШИТЕ ПРЯМО СЮДА

Что сказал куратор, что ответила администрация, к чему вернуться.

Рабочая копия участника проекта. Отметки на бумаге в общую версию не попадают — вносите их в Штаб или передайте руководителю проекта.
Документы и черновики — в репозитории NiceGenn/Team-28.
