Отчетная презентация проекта

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счёт перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата



ПЕРИМЕТР ПРОЕКТА:
Администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, приём сообщений, три направления, подразделения-исполнители, Глава округа. Охват — 27 населённых пунктов

ДОКЛАДЧИК: Уваров Геннадий Геннадьевич

ОРГАНИЗАЦИЯ: Администрация Благовещенского муниципального округа

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. ВОВЛЕЧЁННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчик процесса: Администрация Благовещенского муниципального округа
Границы проекта: от возникновения проблемы содержания территории округа — до подтверждённого устранения проблемы и оценки результата жителем
Периметр проекта: администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, выявляющие проблемы на территории; подразделение приёма сообщений; три направления (УДС, Благоустройство, ЖКХ) и подразделения-исполнители; Глава округа — контроль сроков и эскалация. Охват — 27 населённых пунктов
Владелец процесса: Башун Александр Александрович — глава Благовещенского муниципального округа
Руководитель проекта: Уваров Геннадий Геннадьевич — начальник отдела информационного обслуживания Финансового управления администрации Благовещенского округа
Команда проекта: «Лидеры перемен», 5 чел.: Уваров Г.Г. (капитан) · Вихрова А.В. (МБУ «Информационный центр») · Воронцова Д.С. (благоустройство, УЖКХ) · Комчадалова А.А. (архитектура и градостроительство) · Степаненко А.О. (советник главы)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Описание проблемы: плановое выявление проблем не ведётся — проблема попадает в работу после обращения жителя; канала для сообщений от инициативных групп граждан не предусмотрено; весь объём обращений вручную распределяет Глава округа; срок рассмотрения — 30 календарных дней, единый для любой сложности; повторные обращения об одном объекте не выявляются
Источник проблематики: инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа; внутренняя и внешняя обратная связь
Ключевой риск: сохранение действующего порядка: процесс занимает до 44 дней (оценочная модель), запущенный дефект дороже своевременного; бумажный документооборот по 59-ФЗ растёт; повторные обращения и жалобы в надзорные органы, снижение доверия жителей
Влияние на цели и задачи: содержание территории округа; клиентоцентричность — федеральный проект «Государство для людей»
Тиражируемость: возможна: во всех муниципальных образованиях области


3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Показатель	Ед. изм.	База	Цель
Обращения граждан по благоустройству и ЖКХ	шт./мес.	40	**снижение ≥ 30 %**
Время протекания процесса	календ. дн.	10 — 44	**сокращение ≥ 50 %**
Проблемы, выявленные до обращения жителя	%	0	**≥ 50**
Заявки с фотофиксацией устранения	%	0	**100**
Трудозатраты на регистрацию сообщения	мин.	15	**≤ 1**
Средняя оценка жителем результата	балл	не изм.	**≥ 4,0**

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	22.07.2026	31.07.2026
1. Диагностика и целевое состояние	03.08.2026	04.09.2026
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса	24.08.2026	31.08.2026
1.2. Сбор фактических данных	03.08.2026	24.08.2026
1.3. Разработка карты целевого состояния процесса	01.09.2026	03.09.2026
1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта	03.09.2026	04.09.2026
2. Реализация плана мероприятий по реализации проекта	07.09.2026	23.09.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	07.09.2026	07.09.2026
2.2. Внедрение мероприятий	08.09.2026	23.09.2026
3. Анализ результатов и закрытие проекта	24.09.2026	30.09.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	24.09.2026	25.09.2026
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	28.09.2026	28.09.2026
3.3. Разработка стандарта (норматива) и тиражирование	28.09.2026	29.09.2026
3.4. Закрытие проекта (отчёт руководителю)	30.09.2026	30.09.2026

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

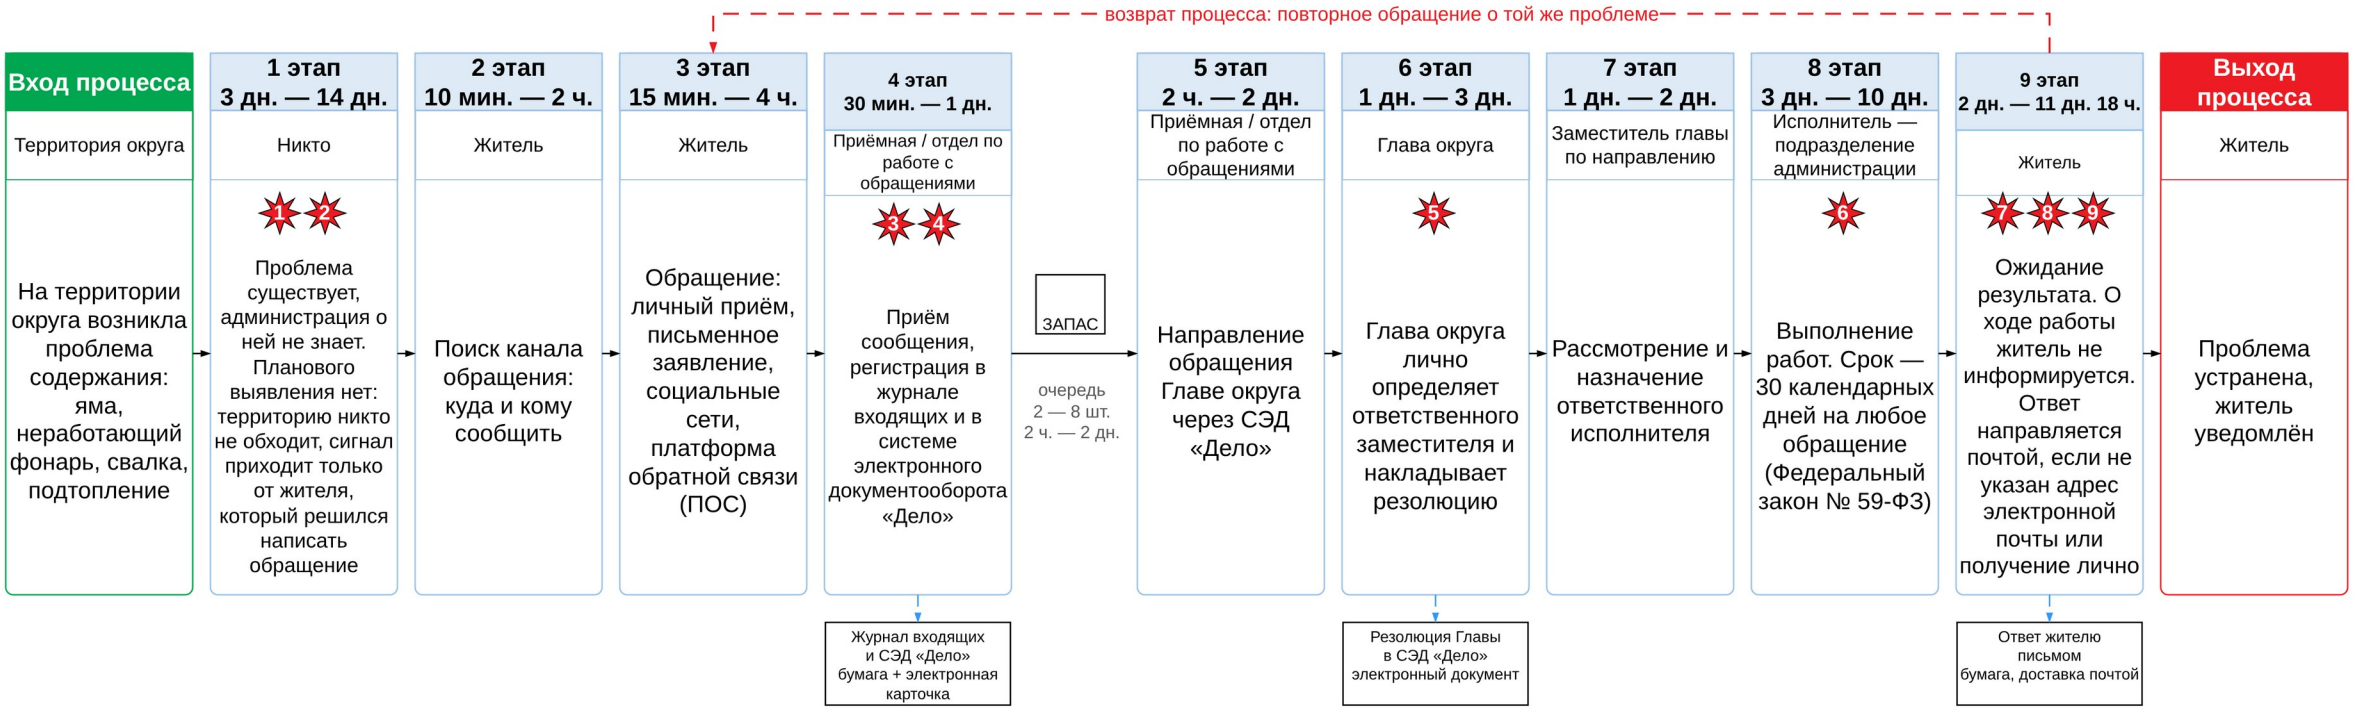

Общее время протекания процесса = 10 дн. 2 ч. 55 мин. — 44 дн.

Время указано в календарных днях. 30 дней — предельный срок НАПРАВЛЕНИЯ ответа по Федеральному закону № 59-ФЗ; ещё до недели занимает доставка ответа почтой, закон её не ограничивает

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТЕРИ:

1. Планового выявления проблем нет: администрация узнаёт о проблеме только тогда, когда житель напишет обращение — до двух недель проблема существует и никем не устраняется
2. Инициативные группы граждан и активные жители видят проблемы каждый день, но канала, чтобы передать их в работу, у них нет: наблюдение не превращается в заявку
3. Сообщение фиксируется в свободной форме — суть, адрес и контакт записываются неполно, детали теряются
4. Сводка для руководства собирается вручную по журналу: предварительный срез данных занимает неделю, сведения о просрочке и нагрузке запаздывают
5. Маршрут каждого обращения определяет лично Глава округа: заявка о яме или неработающем фонаре ждёт решения первого лица наравне со сложным вопросом
6. Нормативный срок один для всего — 30 календарных дней и на сложный вопрос, и на заявку о яме, которую можно закрыть за день
7. О ходе работы житель не информируется: до истечения срока он не знает, принято ли сообщение и кто им занимается
8. Повторные обращения об одной и той же проблеме не выявляются: работа по одному объекту заводится и выполняется несколько раз
9. Ответ идёт почтой, если житель не указал электронную почту или получение лично: до недели сверх нормативного срока, в зависимости от населённого пункта округа

Условные обозначения


- — вход процесса
- — выход процесса
- — направление процесса
- — потеря (проблема), номер — в списке слева
- — объект данных: журнал, записка, сводка
- — запас — сообщения, принятые, но ещё не отписанные: лежат между этапами и ждут очереди
- — возврат процесса при выявлении проблем

Длительности этапов — экспертная оценка владельца процесса, сроки рассмотрения — по системе документооборота

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

Диаграмма Исикавы и «5 почему»

Оптимизация процесса устранения проблем благоустройства и содержания территории Благовещенского муниципального округа за счет перехода от реагирования на обращения к их плановому выявлению и контролю результата

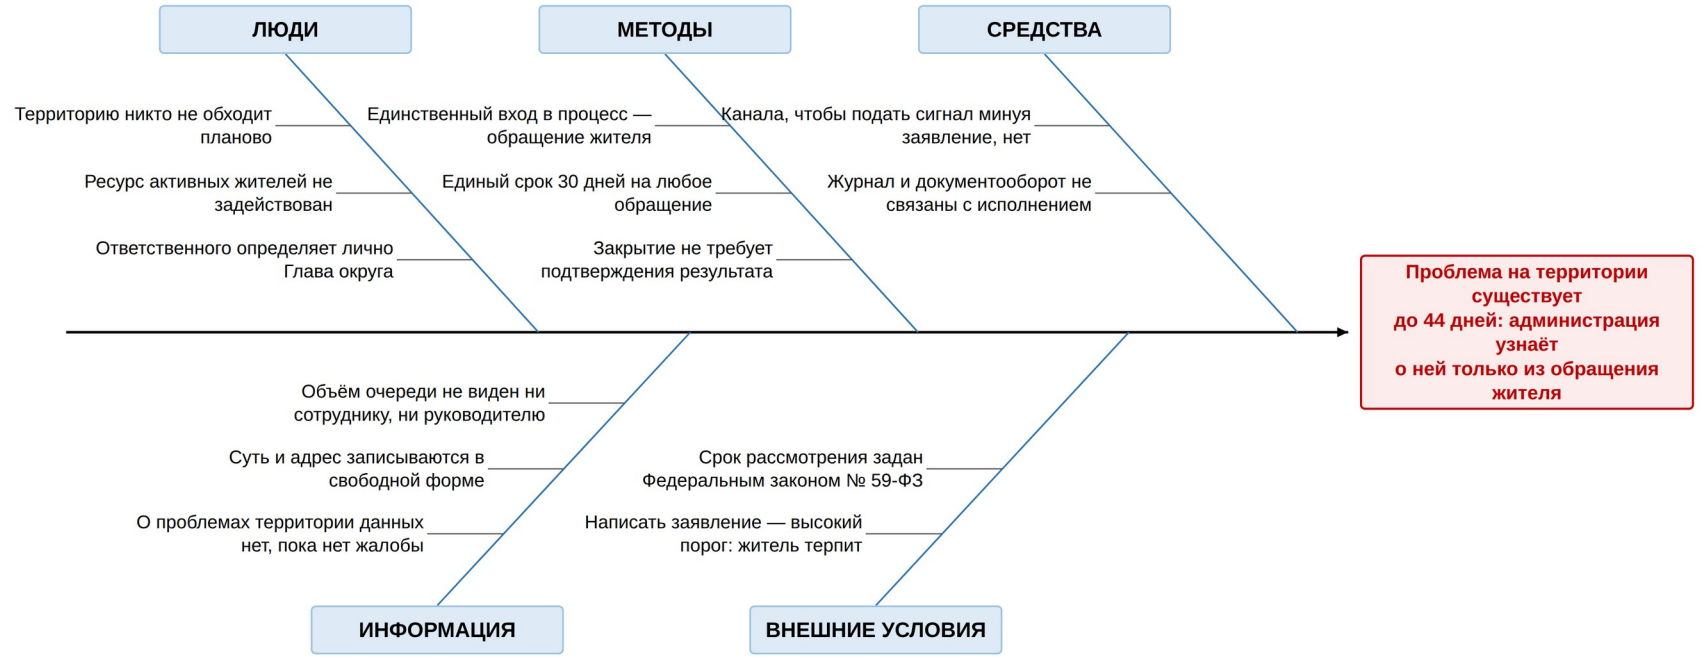

«5 ПОЧЕМУ»: от следствия к корню

1	**Почему проблема на территории существует так долго?**	Потому что администрация узнаёт о ней только тогда, когда житель напишет обращение, — а до этого проблема никем не выявлена.
2	**Почему администрация узнаёт о проблеме только от жителя?**	Потому что планового выявления нет: территорию никто не обходит с задачей находить проблемы и заводить их в работу.
3	**Почему территорию никто не обходит?**	Потому что обход не даёт результата: увиденное некуда подать. Активные жители и сотрудники видят проблемы каждый день, но канала у них нет.
4	**Почему увиденное некуда подать?**	Потому что единственный вход в процесс — обращение по Федеральному закону № 59-ФЗ: чтобы проблема попала в работу, нужно заявление.
5	**Почему единственный вход — обращение?**	Потому что выявление проблемы и рассмотрение обращения никогда не разделялись — это одна процедура, и другой в администрации не заведено.

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: выявление проблемы не отделено от рассмотрения обращения. Пока житель не написал заявление, проблемы для процесса не существует — сколько бы людей её ни видело

ВОСЕМЬ ВИДОВ ПОТЕРЬ

1. **Перепроизводство —** по каждому сообщению об одной проблеме заводится отдельная работа
2. **Лишние движения —** зона ответственности и история обращений ищутся вручную
3. **Ненужная транспортировка —** суть пересказывается по цепочке, детали теряются
4. **Излишние запасы —** очередь 2–8 сообщений, объём работы никому не виден
5. **Избыточная обработка —** одно сообщение переписывается трижды
6. **Ожидание —** ГЛАВНАЯ: до 14 дней проблема не выявлена и ещё до 30 — рассмотрение
7. **Переделка и брак —** фотофиксация устранения не предусмотрена — обращение поступает повторно
8. **Неиспользование потенциала —** сообщения инициативных групп в процесс не поступают; объём обращений распределяет Глава округа

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Вход процесса	1 этап 1 дн. — 7 дн.	2 этап 2 мин. — 5 мин.	3 этап 1 мин. — 3 мин.	4 этап 1 мин.	5 этап 1 мин. — 2 мин.	6 этап 15 мин. — 4 ч.	7 этап 2 ч. — 3 дн.	8 этап 5 мин. — 15 мин.	9 этап 10 мин. — 7 дн.	Выход процесса
Территория округа	Инициативная группа	Инициативная группа / житель	Сервис приёма сообщений	Сервис приёма сообщений	Сервис приёма сообщений	Исполнитель — подразделение администрации	Исполнитель — подразделение администрации	Исполнитель — подразделение администрации	Инициативная группа / житель	Житель
На территории округа возникла проблема содержания: яма, неработающий фонарь, свалка, подтопление	1 2 Проблему находят на месте участники инициативных групп при обходе территории. Обращение жителя не требуется	3 Заявка в мессенджер MAX: текст, фотография, геометка. Один канал, знакомое приложение	4 Автоматическая регистрация. ИИ определяет категорию, адрес и срочность	11 Проверка на повтор: заявки об одной проблеме объединяются	5 7 8 Маршрутизация исполнителю по цепочке ответственных. Срок исполнения ставится автоматически	6 Заявка приходит целиком: текст, фото, точка на карте. Кнопка «Взять в работу»	Выполнение работ в установленный срок. Просрочка поднимается заму направления, затем Главе округа	9 Ответ о результате: текстовое описание работ. Фото и другие материалы — при наличии.	10 12 Подтверждение и оценка 1–5 от жителя. Нет ответа — закрытие оператором. Оценка ≤2 — возврат в работу.	Проблема устранена, результат подтверждён и принят жителем

Карточка заявки в единой очереди электронная, видна всем ролям

Срок исполнения по категории таймер, эскалация по просрочке

Отчёт: текст, фото при наличии

Общее время протекания процесса = 1 дн. 2 ч. 35 мин. — 17 дн. 4 ч. 26 мин.

Было: 10 дн. 2 ч. 55 мин. — 44 дн.. Стало: 1 дн. 2 ч. 35 мин. — 17 дн. 4 ч. 26 мин.. Время указано в календарных днях

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Плановое выявление: инициативные группы обходят закреплённую территорию и подают заявки сами — проблема попадает в работу до обращения жителя
2. Ресурс активных жителей включён: инициативные группы получают роль в сервисе и подают заявки через тот же бот
3. Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX: выбирать способ обращения больше не нужно
4. Структурированный приём: текст, фотография и геометка в одном сообщении; категорию, адрес и срочность определяет ИИ-классификатор
5. Заявка уходит исполнителю сразу после классификации — очередь на разбор исчезает, объём работы виден на дашборде
6. Отчётность строится сама: сроки, нагрузка и статистика по направлениям в панели администрации в реальном времени
7. Маршрутизация по цепочкам ответственных без участия первого лица: Глава округа подключается только при эскалации
8. Срок исполнения ставится по категории заявки и контролируется таймером; просрочка поднимается заму направления, затем Главе округа
9. Результат фиксируется текстовым ответом; фото при наличии. Закрытие оператором не означает личного подтверждения жителя.
10. Автор заявки получает уведомление о каждом изменении статуса в свой мессенджер — от приёма до устранения
11. Дедупликация по координатам и нормализованному адресу: заявки об одной проблеме объединяются автоматически
12. Ответ приходит в мессенджер в момент закрытия заявки — доставка почтой не требуется

Условные обозначения

- — вход процесса
- — выход процесса
- — направление процесса
- — мероприятие, номер — в списке слева
- — объект данных: карточка заявки, срок, фотоотчёт

Номера мероприятий совпадают с номерами проблем на карте текущего состояния

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий
1	Проблема выявляется только по жалобе жителя: планового обхода территории нет	Инициативные группы граждан: получают роль в сервисе и подают заявки по итогам обхода территории	Степаненко А.О. Воронцова Д.С.	08.09 — 19.09.2026
2	Разрозненные каналы приёма, ручная регистрация	Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX	Уваров Г.Г. Степаненко А.О.	08.09 — 12.09.2026
3	Ручное определение сути, адреса и ответственного	ИИ-классификация обращения, каскад геопривязки, слова-подсказки категорий	Уваров Г.Г. Вихрова А.В.	08.09 — 16.09.2026
4	Потеря сообщений при передаче, отсутствие учёта сроков	Маршрутизация по цепочкам ответственных, SLA-таймеры, ступенчатая эскалация	Воронцова Д.С.	14.09 — 19.09.2026
5	Дублирование работ по повторным обращениям	Дедупликация по координатам и нормализованному адресу	Уваров Г.Г.	15.09 — 19.09.2026
6	Формальное закрытие, отсутствие обратной связи автору заявки	Доказательное закрытие с фотоматериалом, уведомление автора, оценка 1–5	Комчадалова А.А.	16.09 — 23.09.2026

Ответственные — состав проектной команды по распоряжению администрации округа от 24.09.2026 № 534-р. Сроки внутри этапа «Внедрение мероприятий», 08.09 — 23.09.2026

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	РЕЗУЛЬТАТ МЕРОПРИЯТИЯ
1	Инициативные группы граждан: получают роль в сервисе и подают заявки по итогам обхода территории	Проблема попадает в работу до обращения жителя; ресурс активных жителей включён в процесс
2	Единый цифровой канал приёма в мессенджере MAX	Регистрация без участия сотрудника, время регистрации — секунды
3	ИИ-классификация обращения, каскад геопривязки, слова-подсказки категорий	Категория, адрес и срочность определяются автоматически
4	Маршрутизация по цепочкам ответственных, SLA-таймеры, ступенчатая эскалация	Доведение до исполнителя без ручной передачи и без резолюции; срок на каждой заявке, просрочка поднимается заместителю, затем Главе — сокращение времени протекания процесса
5	Дедупликация по координатам и нормализованному адресу	Обращения об одной проблеме склеиваются автоматически
6	Доказательное закрытие с фото или отчётом, уведомление автора, оценка 1–5	Оценка ≤ 2 автоматически возвращает заявку в работу

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛЬ	БАЗА	ЦЕЛЬ	ФАКТ	КОММЕНТАРИЙ
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ	40	снижение ≥ 30 %	замер по итогам квартала	шт./мес.; это обращения в документообороте, а не заявки: срок рассмотрения 30 дней, за два месяца пилота динамики нет
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения	10 — 44	сокращение ≥ 50 %	полный цикл не измерен	№68: 25 ч 8 мин. от подачи (27.09 16:04 →28.09 17:12). Полный цикл не измерен; 7,5 суток — сумма медиан.
Доля проблем, выявленных до обращения жителя	0	≥ 50	85 % (11 из 13)	%; в пилоте заявки подавала в основном команда — на потоке доля будет ниже; цель 50 % от этого не меняется
Доля заявок с фотофиксацией устранения	0	100	67 % (4 из 6)	Фото 4 из 6 закрытых —67%; вдвух был отчёт. Цель 100% пока не достигнута.
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю	15	≤ 1	0	мин.; регистрация, категория, адрес и маршрут к исполнителю — без участия сотрудника
Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5	не измерялась	≥ 4,0	5,0	№68: 5/5, подтверждение 28.09.2026. Отдельно от показателей раннего среза.

Показатели пилота — по ранее подготовленным материалам проекта; пример№68 и одна оценка 5/5 —28.09.2026. Расчётный эффект 476 ч/год. Затраты на заявленные закупки и подрядчика —0 руб., не стоимость всех ресурсов.

КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ

Вход процесса	1 этап 1 дн. — 7 дн. (расчёт)	2 этап 2 мин. — 5 мин. (расчёт)	3 этап 1 мин. — 3 мин. (расчёт)	4 этап 1 мин. (расчёт)	5 этап 1 мин. — 2 мин. (расчёт)	6 этап 15 мин. — 4 ч. (расчёт)	7 этап 2 ч. — 3 дн. (расчёт)	8 этап 5 мин. — 15 мин. (расчёт)	9 этап 10 мин. — 7 дн. (расчёт)	Выход процесса
Территория округа	Инициативная группа	Инициативная группа / житель	Сервис приёма сообщений	Сервис приёма сообщений	Сервис приёма сообщений	Исполнитель — подразделение администрации	Исполнитель — подразделение администрации	Исполнитель — подразделение администрации	Инициативная группа / житель	Житель
На территории округа возникла проблема содержания: яма, неработающий фонарь, свалка, подтопление	Проблемы находят на местах инициативные группы при обходе территории. Обращение жителя не требуется	Заявка в мессенджер MAX: текст, фотография, геометка	Автоматическая регистрация. ИИ определяет категорию, адрес и срочность	Проверка на повтор: заявки об одной проблеме объединяются	Маршрутизация исполнителю по цепочке ответственных. Срок исполнения ставится автоматически	Заявка приходит целиком: текст, фото, точка на карте. Кнопка «Взять в работу»	Выполнение работ в установленный срок. Просрочка поднимается заму направления, затем Главе округа	Ответ о результате: текстовое описание работ. Фото и другие материалы — при наличии.	Подтверждение и оценка 1–5 от жителя. Нет ответа — закрытие оператором. Оценка ≤2 — возврат в работу.	Проблема устранена, результат подтверждён и принят жителем
		Карточка заявки в единой очереди электронная, видна всем ролям		Срок исполнения по категории таймер, эскалация по просрочке			Отчёт: текст, фото при наличии			

Расчётное время протекания процесса = 1 дн. 2 ч. 35 мин. — 17 дн. 4 ч. 26 мин. (расчёт)

Было: 10 дн. 2 ч. 55 мин. — 44 дн. (модель). №68: 27.09 16:04 → 28.09 17:12, 25 ч. 8 мин. от подачи до подтверждения; 7,5 суток — сумма медиан, не максимум.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Показатель	Было	Стало
Количество обращений граждан по благоустройству и ЖКХ, шт./мес.	40	замер по итогам квартала
Время протекания процесса: от возникновения проблемы до подтверждённого устранения, календ. дн.	10 — 44	полный цикл не измерен; №68 от подачи:25 ч.8 мин.
Доля проблем, выявленных до обращения жителя, %	0	85 (11 из 13)
Доля заявок с фотофиксацией устранения, %	0	67 (4 из 6)
Трудозатраты сотрудника на регистрацию одного сообщения и передачу исполнителю, мин.	15	0
Средняя оценка жителем результата, шкала 1–5, балл	не измерялась	5,0 (одна оценка)
Доля повторных обращений об одной и той же проблеме, %	не измерялась	1 повтор из 13 заявок
Очередь необработанных сообщений, шт.	2 — 8	0 в ожидании маршрутизации; 3 на проверке классификации

Условные обозначения

- — вход процесса
- — выход процесса
- → — направление процесса
- — объект данных: карточка заявки, срок, фотоотчёт

Проблем и мероприятий на карте нет: процесс уже работает так, как задумано. В этом и смысл карты достигнутого состояния

Ранее зафиксированные показатели пилота. №68: подача 27.09, подтверждение 28.09; одна оценка 5/5 — 28.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Эффект от внедрения

Время протекания процесса — от 10 до 44 календарных дней, из них до 14 дней проблема не выявлена. Очередь на разбор — 2–8 сообщений.

Что	Как было	Подробнее
Выявление проблемы	**только по жалобе**	планового обхода территории нет; ожидание обращения в оценочной модели карты — 3–14 дней
Кто сообщает	**только заявитель о своей проблеме**	все четыре канала рассчитаны на обращение жителя по своему вопросу. Для инициативной группы, фиксирующей за обход десяток проблем, это десяток обращений по 59-ФЗ со сроком 30 дней и письменным ответом на каждое
Каналов приёма	**четыре разрозненных**	личный приём, письменное заявление, социальные сети, платформа обратной связи
Регистрация	**вручную**	журнал входящих и карточка в системе документооборота, суть и адрес записываются в свободной форме
Маршрут	**через первое лицо**	ответственного заместителя определяет лично Глава округа — и для сложного вопроса, и для заявки о яме
Срок	**30 календарных дней**	один на любое обращение; о ходе работы житель не информируется
Ответ	**почтой**	до недели сверх нормативного срока, в зависимости от населённого пункта
Подтверждение результата	**только письменный ответ**	о принятых мерах житель уведомляется письмом. Но фотофиксации устранения нет ни у исполнителя, ни у руководителя, и согласен ли житель с результатом — нигде не фиксируется
Повторные обращения	**не выявляются**	работа по одному объекту заводится и выполняется несколько раз
Отчётность	**вручную**	предварительный срез данных по обращениям занимает неделю

Сюда же — фотографии прежнего рабочего процесса: журнал регистрации, стол приёмной, стопка письменных заявлений

ПРИЛОЖЕНИЕ. Эффект от внедрения

№68:27.09 16:04 →28.09 17:12, 25 часов 8 минут от подачи до личного подтверждения. Это не замер физических работ. 7,5 суток — сумма медиан, не максимум случаев. Охват —27 населённых пунктов.

Что	Как стало	Подробнее
Выявление проблемы	**плановое, до жалобы**	инициативные группы обходят закреплённую территорию и подают заявки сами; обращение жителя перестаёт быть единственным входом в процесс
Кто сообщает	**инициативные группы и жители**	инициативные группы граждан и жители, чаще других сообщавшие о проблемах, получают роль в сервисе — отдельной системы не требуется
Каналов приёма	**один цифровой**	мессенджер MAX: текст, фотография и геометка в одном сообщении; архитектура канально-независимая, подключение других каналов не требует переделки ядра
Регистрация	**автоматическая**	искусственный интеллект определяет категорию, адрес и срочность; 18 категорий в трёх направлениях
Маршрут	**по цепочке ответственных**	без участия первого лица; Глава округа подключается только при эскалации
Срок	**по категории заявки**	таймер на каждой заявке; просрочка поднимается заму направления, затем Главе округа
Ответ	**в мессенджер сразу**	Уведомления о статусе и результате; текстовый ответ, фото при наличии.
Подтверждение результата	**ответ жителя или закрытие**	Текстовый отчёт; фото при наличии. Автор может подтвердить и оценить 1–5. Оценка ≤2 — возврат. Нет ответа — закрытие оператором или автозакрытие через 7 дней, без личного подтверждения.
Повторные обращения	**объединяются**	дедупликация по координатам — 100 м за 14 дней — и по нормализованному адресу
Отчётность	**в реальном времени**	сроки, нагрузка и статистика по направлениям в панели администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ. Стандарты и нормативы

Стандартизация результата — обязательное требование методики: улучшение должно быть закреплено документом, который применяется.

Документ	Что закрепляет	Состояние
Распоряжение администрации округа от 24.09.2026 № 534-р	Открывает проект, закрепляет состав команды и сроки	подписано Главой округа
Регламент работы сервиса приёма сообщений	Одиннадцать разделов: роли и права, каналы приёма, классификация, дедупликация, маршрутизация и сроки, закрытие и подтверждение результата, эскалация, особые случаи, контроль	разработан
Памятки по ролям, приложение к регламенту	Шесть памяток: житель, участник инициативной группы, исполнитель, руководитель направления, глава округа, оператор панели — раздаются самой панелью	применяются
Числовые параметры процесса	Сроки, радиус и период объединения, автоподтверждение описаны в приложении к разработанному регламенту	описаны

ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЁННЫЕ В ПРОЕКТЕ — девять при пороге в пять. После тире — лист презентации, на котором инструмент виден

1. Картирование процесса — три карты: текущее, целевое, достигнутое — листы 3, 5, 9
2. «Пять почему» — цепочка до коренной причины — лист 4
3. Диаграмма Исикавы — 13 факторов по пяти категориям — лист 4
4. Восемь видов потерь — реестр с оценкой влияния на время процесса — лист 4
5. Голос клиента — личное подтверждение результата автором №68 — лист 16
6. Визуализация — статусы, сроки, карта заявок, плотность проблем — лист 17
7. Канбан — доска заявок по статусам — лист 18
8. Стандартизация — регламент сервиса и памятки по ролям — таблица на этом листе
9. Защита от ошибок — для выполнения нужны фото или отчёт; сквозная дедупликация — листы 15 и 16

Регламент разработан; для подтверждения введения нужны подписанные документы согласования/утверждения и ознакомления. Распоряжение №534-р открывает проект и не заменяет утверждение регламента.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Дополнительная информация о проекте

Наличие публикации о реализации проекта (соц.сети оив, местные, федеральные СМИ) - ссылка	Официальный сайт администрации Благовещенского муниципального округа — https://blgraion.amurobl.ru/ : публикации о работе сервиса приёма сообщений «Точка перемен», о порядке подачи заявки жителем и о результатах устранения проблем на территории округа
Масштабность проекта (в процессе задействованы (структурные подразделения ОИВ, иные ОИВ и подведомственные учреждения)	Администрация Благовещенского муниципального округа: инициативные группы граждан, выявляющие проблемы на территории; подразделение приёма сообщений, три направления с головными заместителями, подразделения-исполнители, Глава округа. Охват — 27 населённых пунктов
Источники проблематики при выборе темы проекта (обращения граждан, соц. значимость, межведомственное взаимодействие и т.д.)	Инцидент-менеджмент — массовые обращения граждан о состоянии территории округа. Внутренняя и внешняя обратная связь: сообщения инициативных групп граждан по итогам обхода территории и оценка результата жителем по шкале от 1 до 5 — обе поступают в сервис и учитываются в процессе
Стандартизация результатов проекта (стандарт, регламент, алгоритм и т.д.)	Регламент работы сервиса приёма сообщений — одиннадцать разделов — и памятки по ролям для шести ролей процесса; памятки раздаёт сама панель администрации
Реализация проекта с помощью цифровых решений	Собственная разработка нового цифрового решения: сервис приёма сообщений «Точка перемен» в мессенджере MAX, ИИ-классификация обращений, автоматическая маршрутизация, контроль сроков, панель администрации


ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА. Команда «Лидеры перемен», 5 человек — курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж», платформа «Россия — страна возможностей». **Обучение прошли все пятеро**; копии сертификатов — на листе 21 настоящей презентации.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. Содержание территории — то, что жители видят каждый день; охват 27 населённых пунктов округа, большинство — сёла, где канала обращения фактически не было. Проект отвечает клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей» и практике платформы обратной связи. Процесс исполняется во всех муниципальных образованиях области.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Глазами жителя

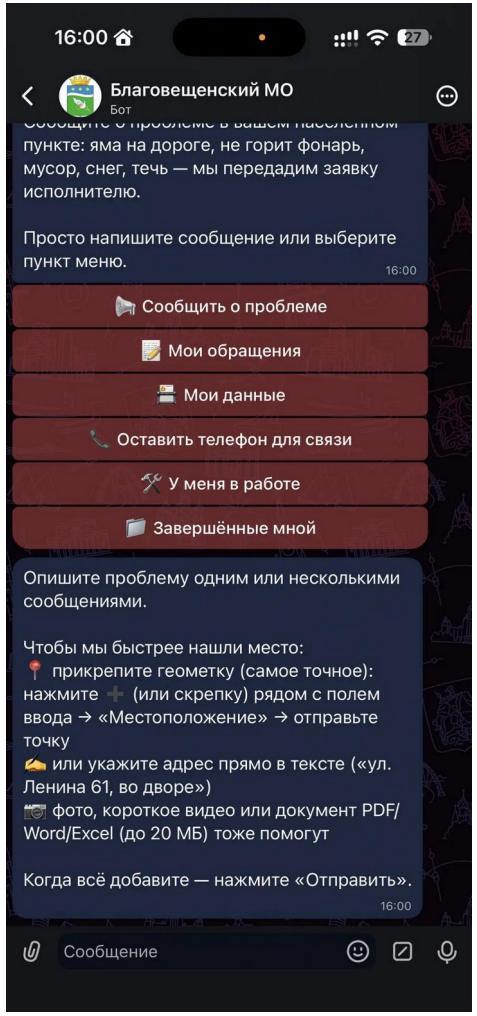

Меню сервиса: бот объясняет, что и как приложить

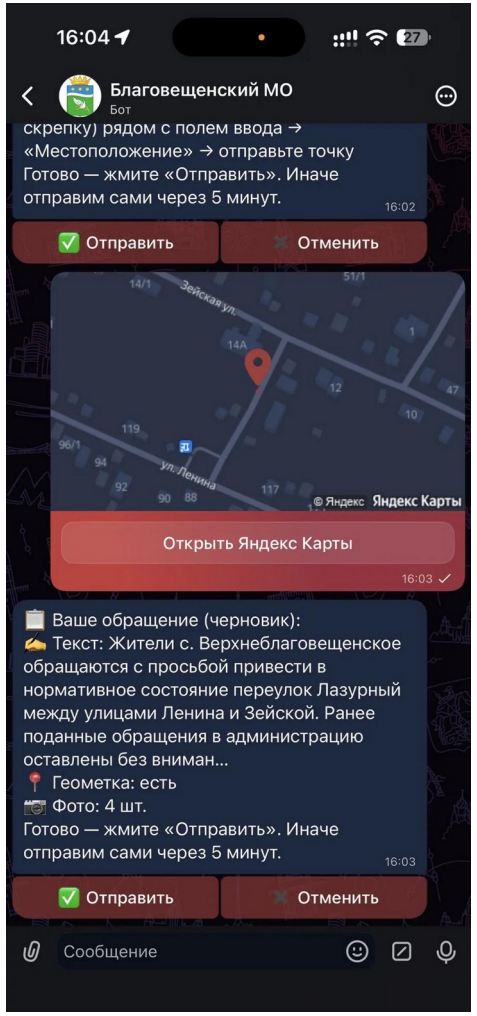


Черновик перед отправкой: текст, геометка, четыре фотографии

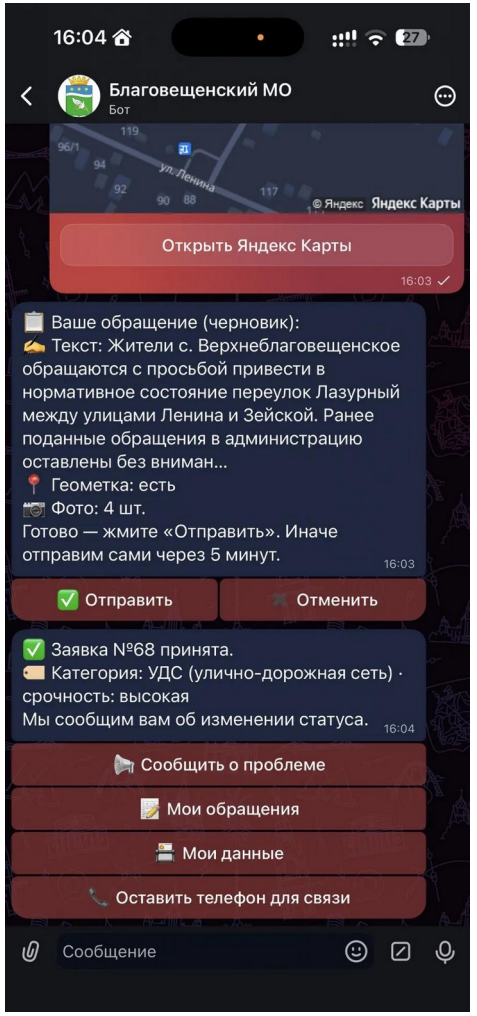


Заявка принята: номер, категория и срочность определены автоматически

Исходные экраны заявки№68. Подача —27 сентября 16:04; личное подтверждение —28 сентября 17:12. Полный интервал от подачи 25 ч 8 мин, не 1 ч 8 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ. У исполнителя

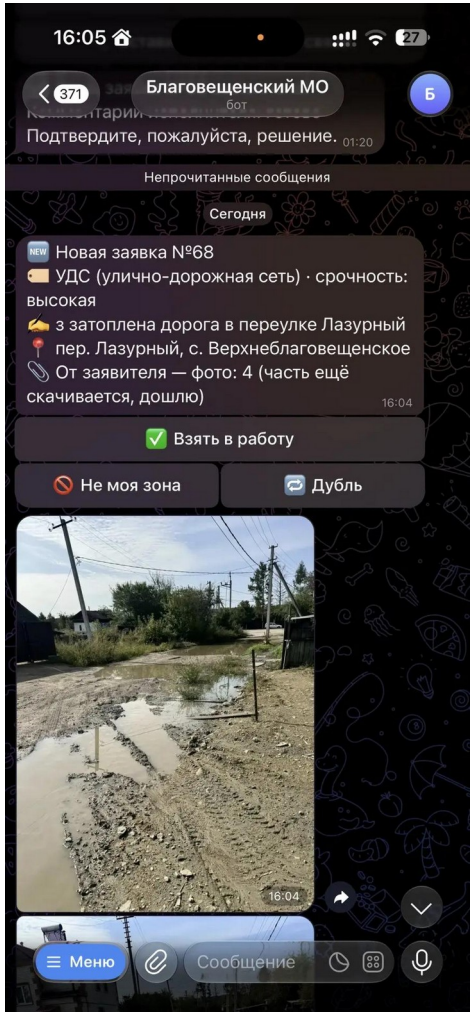


Карточка заявки: категория, срочность, адрес и кнопки ответа

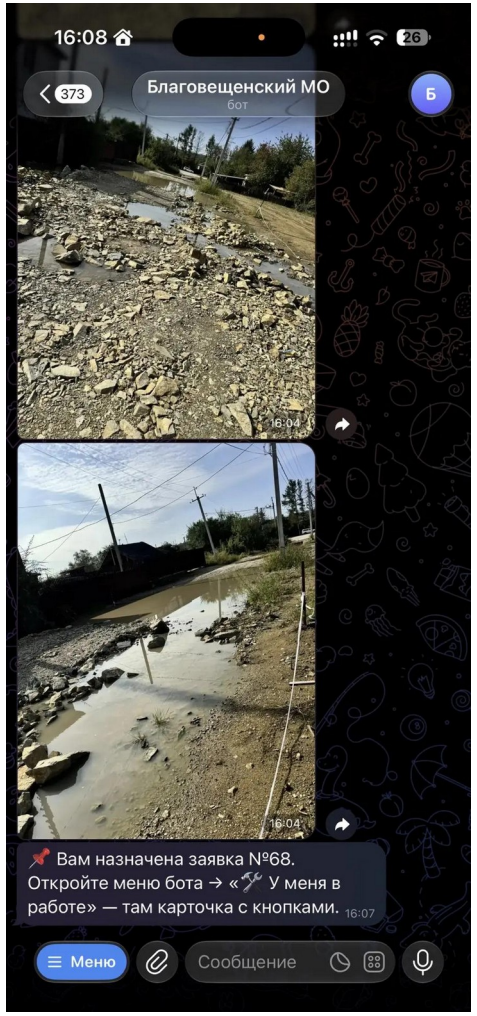


Фотографии заявителя и уведомление о назначении

Исполнитель получает адрес, категорию, фото и срок. Время 16:07 видно на исходном экране; календарный день принятия отдельно не установлен. Итог№68 подтверждён на следующий день после подачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Результат жителю

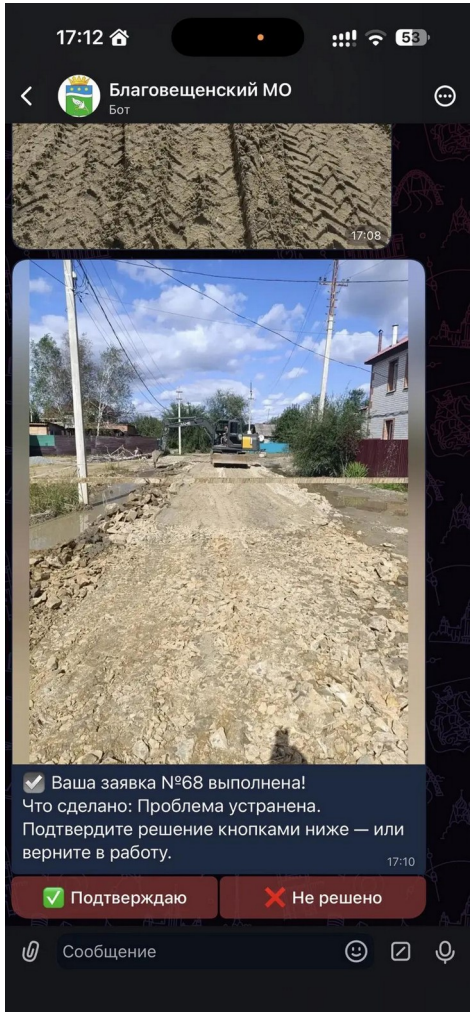


Фотография результата и кнопки «Подтверждаю» / «Не решено»

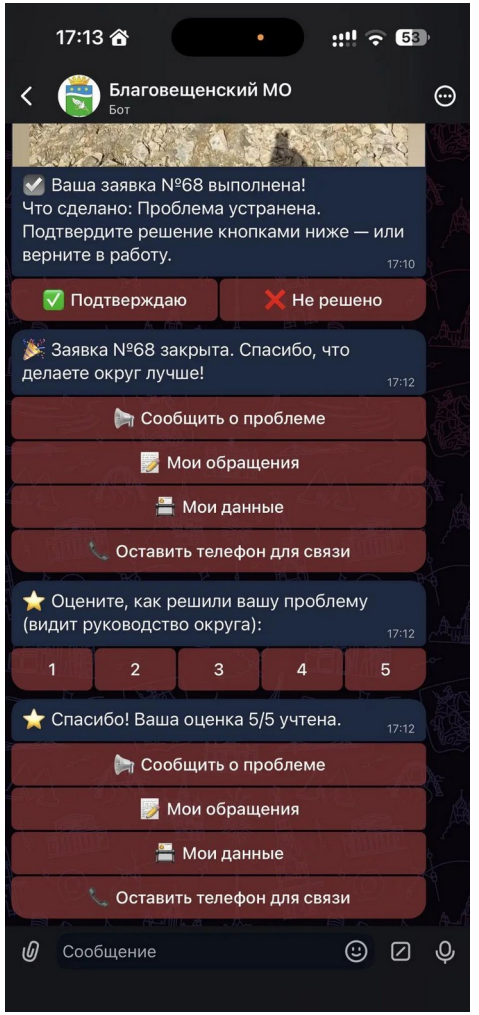


Заявка закрыта, оценка по шкале 1–5 учтена

№68: результат направлен 28.09 в 17:10, автор подтвердил 28.09 в 17:12 и поставил 5/5. От подачи 27.09 в 16:04 —25 ч 8 мин. Фото или отчёт подтверждают исполнение; интервал не равен длительности физических работ.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Панель округа

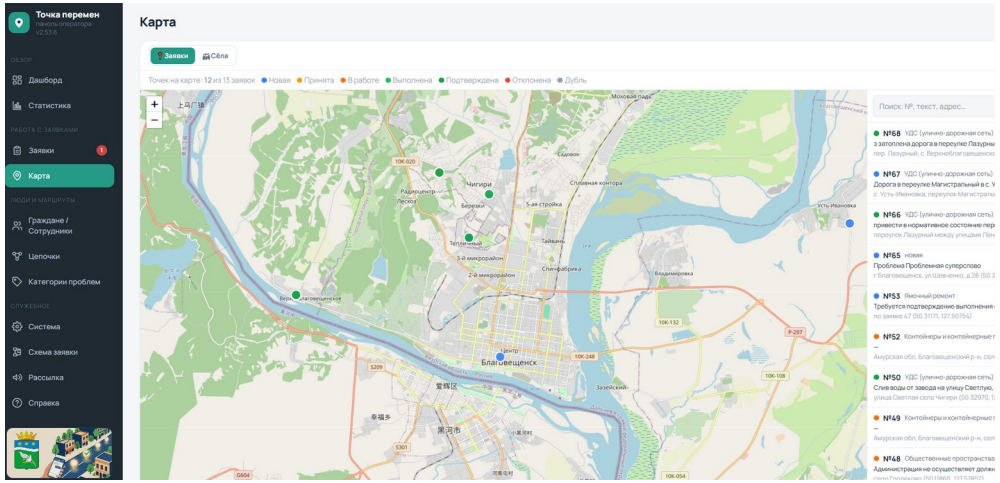

Карта заявок по округу: статус каждой видно цветом

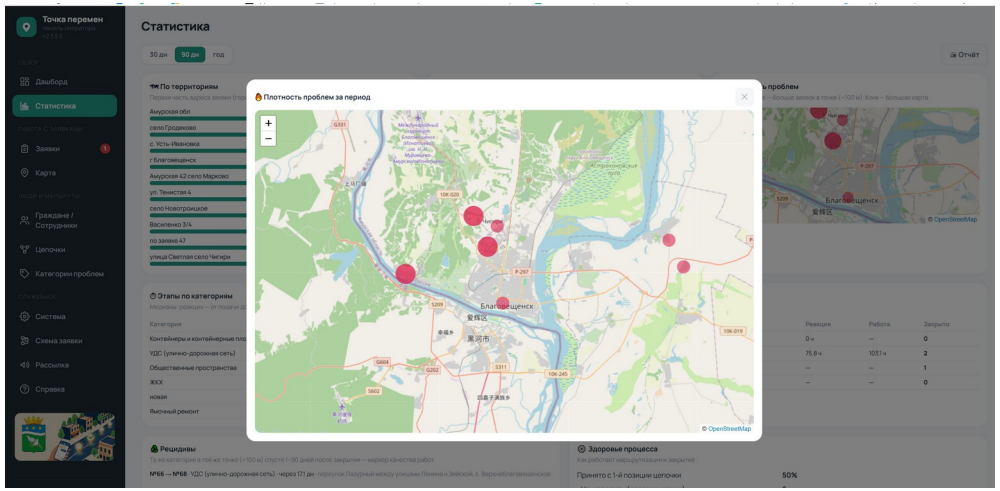


Статистика и плотность проблем: где обращаются чаще

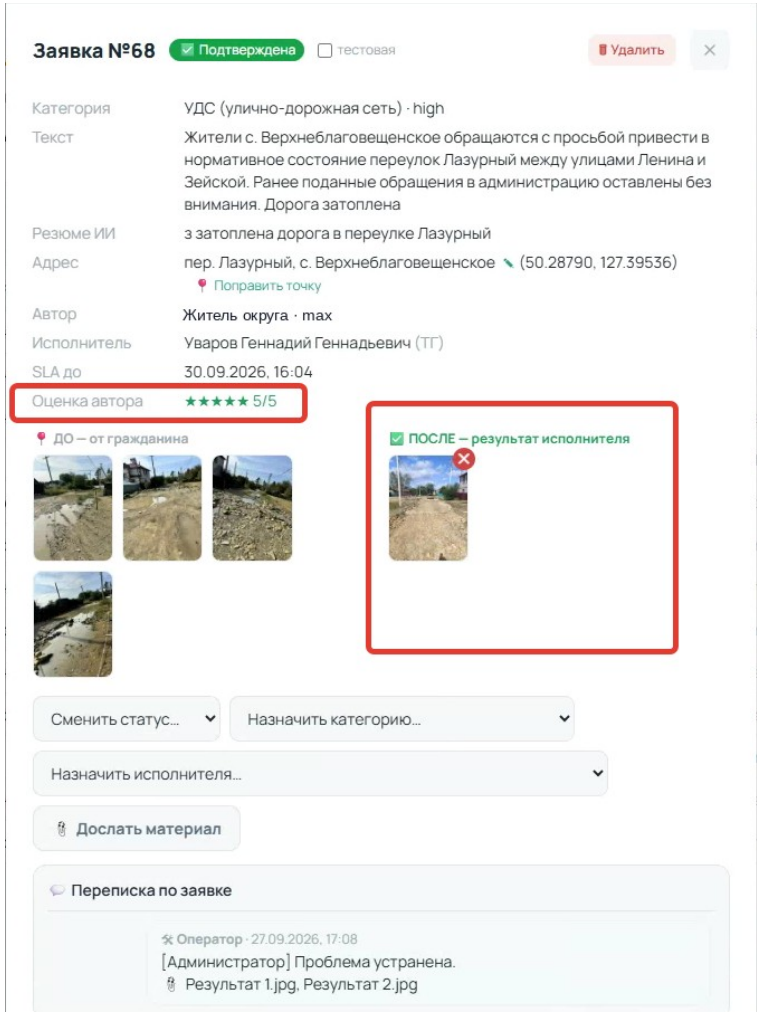

Карточка заявки: фото «до» и «после», оценка жителя, журнал событий

Карта, статистика и карточка№68 в панели. Уточнение руководителя:подача 27.09, подтверждение 28.09, 25 ч 8 мин. Показатели пилота сохранены отдельно от хронологии этого случая.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Доска заявок

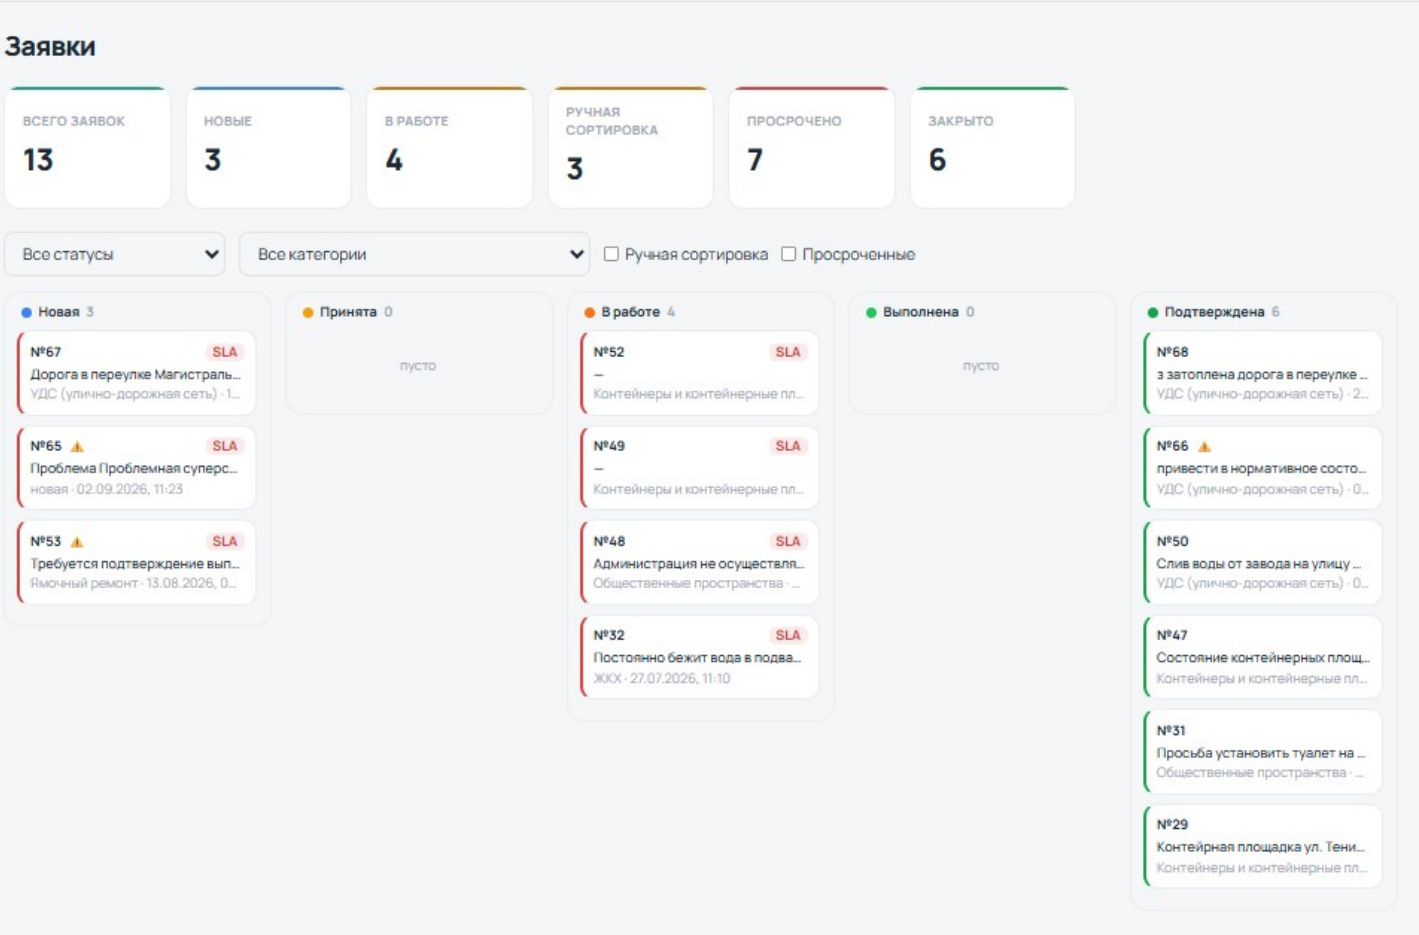

Пять колонок по статусам: новая, принята, в работе, выполнена, подтверждена. Красная отметка SLA — заявка вышла за срок

Канбан — инструмент бережливого управления: работа видна колонками, и сразу понятно, где она скапливается. На снимке колонка «Выполнена» пуста; по одному снимку нельзя определить срок подтверждения результата жителем.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Прежний процесс

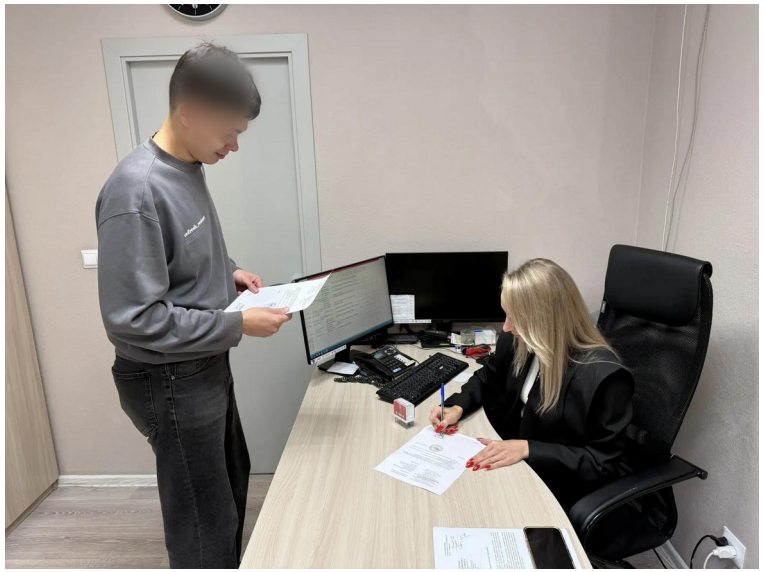

Личный приём: житель приносит заявление, его принимают и штампуют



Разбор письменных обращений: по каждому срок 30 дней, контроль на бумаге

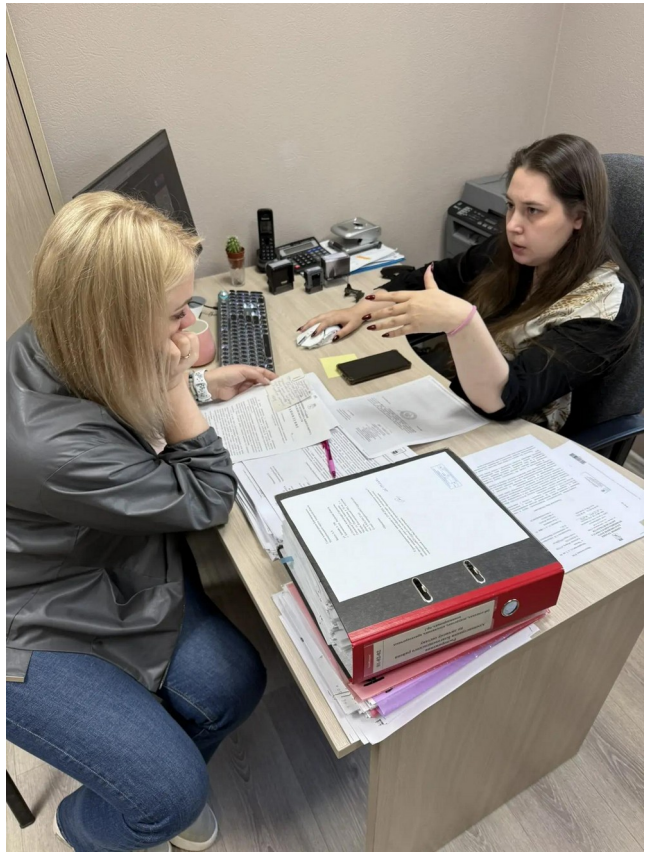


Согласование распоряжений: папки, визы, движение документа между кабинетами

Так сообщение о проблеме попадает в работу без сервиса: житель приходит лично, заявление регистрируют от руки, дальше папки и визы. Для обращений по 59-ФЗ этот порядок сохраняется — проект его не отменяет, а снимает с него заявки о содержании территории.


ПРИЛОЖЕНИЕ. Было и стало



Было: запись в журнале входящих — номер, дата, корреспондент, суть

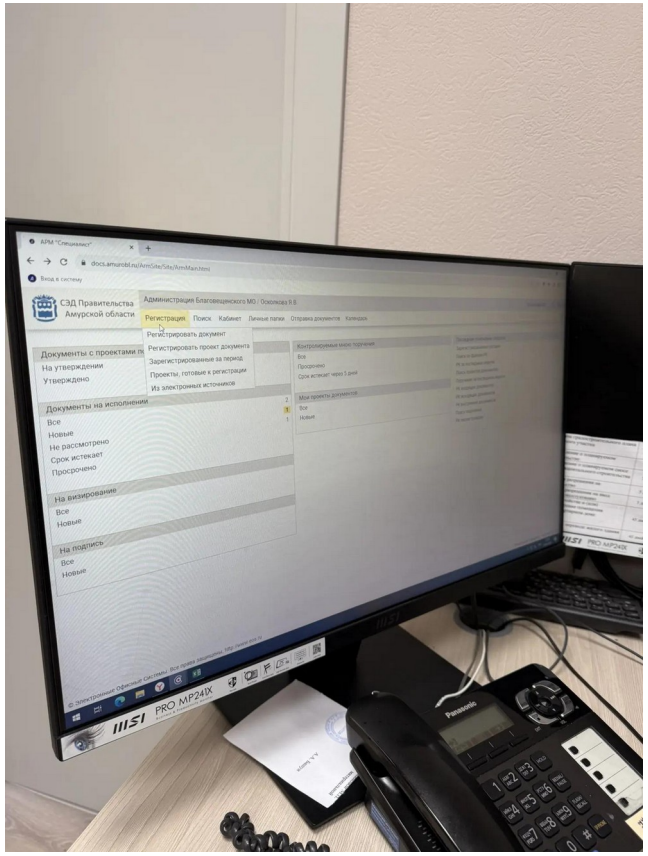


Было: та же запись заводится второй раз, в СЭД «Дело»

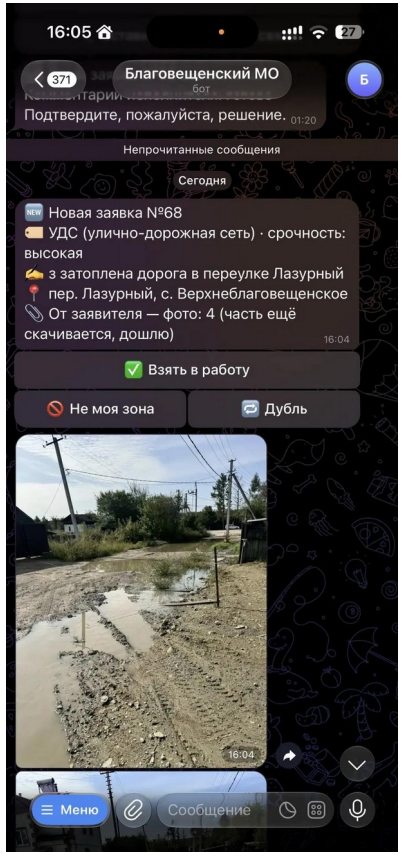

Стало: заявка пришла исполнителю с готовой категорией, адресом и сроком

Одна и та же операция — регистрация сообщения и доведение его до исполнителя — до проекта и после. Слева одно сообщение вносится дважды руками, справа оно приходит исполнителю готовым.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Обучение команды

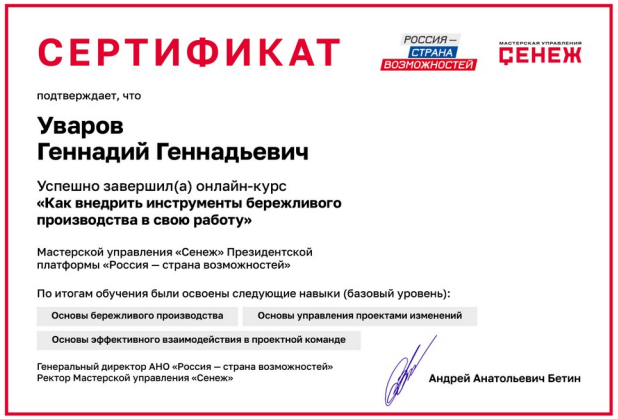

СЕРТИФИКАТ

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНЕЖ

подтверждает, что

Уваров
Геннадий Геннадьевич

Успешно завершил(а) онлайн-курс
«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»


Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

По итогам обучения были освоены следующие навыки (базовый уровень):

Основы бережливого производства | Основы управления проектами изменений | Основы эффективного взаимодействия в проектной команде

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Ректор Мастерской управления «Сенеж»

Андрей Анатольевич Бетин

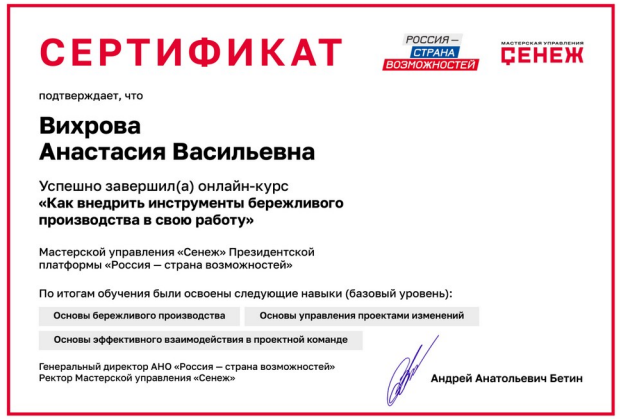

СЕРТИФИКАТ

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНЕЖ

подтверждает, что

Вихрова
Анастасия Васильевна

Успешно завершил(а) онлайн-курс
«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»

Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

По итогам обучения были освоены следующие навыки (базовый уровень):

Основы бережливого производства | Основы управления проектами изменений | Основы эффективного взаимодействия в проектной команде

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Ректор Мастерской управления «Сенеж»

Андрей Анатольевич Бетин



СЕРТИФИКАТ

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНЕЖ

подтверждает, что

Воронцова
Дарья Сергеевна

Успешно завершил(а) онлайн-курс
«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»

Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

По итогам обучения были освоены следующие навыки (базовый уровень):

Основы бережливого производства | Основы управления проектами изменений | Основы эффективного взаимодействия в проектной команде

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Ректор Мастерской управления «Сенеж»

Андрей Анатольевич Бетин



СЕРТИФИКАТ

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНЕЖ

подтверждает, что

Комчадалова
Анна Александровна

Успешно завершил(а) онлайн-курс
«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»


Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

По итогам обучения были освоены следующие навыки (базовый уровень):

Основы бережливого производства | Основы управления проектами изменений | Основы эффективного взаимодействия в проектной команде

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Ректор Мастерской управления «Сенеж»

Андрей Анатольевич Бетин

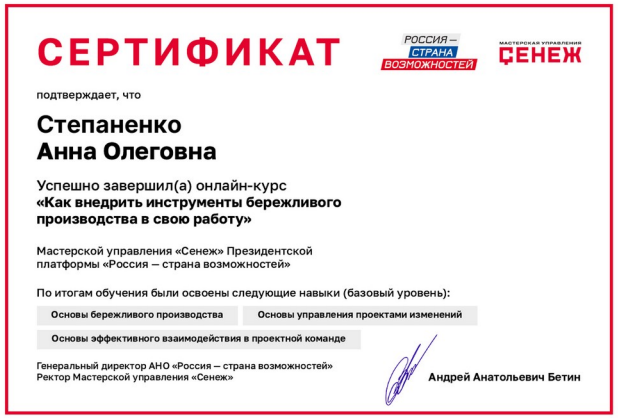

СЕРТИФИКАТ

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕНЕЖ

подтверждает, что

Степаненко
Анна Олеговна

Успешно завершил(а) онлайн-курс
«Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу»

Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

По итогам обучения были освоены следующие навыки (базовый уровень):

Основы бережливого производства | Основы управления проектами изменений | Основы эффективного взаимодействия в проектной команде

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Ректор Мастерской управления «Сенеж»

Андрей Анатольевич Бетин

Онлайн-курс «Как внедрить инструменты бережливого производства в свою работу» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Обучение прошли все пять членов команды — пять сертификатов из пяти, 100 %.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
